



D 2015/17F 0090

DODATEK č. 1

ke smlouvě o zhotovení stavby, č. smlouvy zhotovitele 102010_U.4360_01_2014
ze dne 18. 8. 2014
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

- 1) **Objednatel:** Česká zemědělská univerzita v Praze
sídlo: Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha – Suchbátka
zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
zástupce ve věcech technických: Ing. Miloslava Jungmannová
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 19-5504550287/0100
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné,

a

- 2) **Zhotovitel:** UNISTAV a.s.
sídlo: Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33, okres Brno-město
zastoupený: Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech technických: Ondřej Blaho, MBA
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 64645641/0100
IČO: 00531766
DIČ: CZ00531766
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňuje smlouva o zhotovení stavby, č. smlouvy zhotovitele 102010_U.4360_01_2014, uzavřená dne 18. 8. 2014, jejímž předmětem je zhotovení díla „Přestavba a modernizace pavilonů „A a B“ Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů“ (dále jen „Smlouva“).

Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení stavebních prací (méněprací) při zhotovování díla dohodly, že v rámci předmětu Smlouvy je nutné provést nad sjednaný rámec práce definované obsahem změnových listů č. 1 a č. 2. Dodatečné stavební práce a méněpráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení původní stavby. Změnové listy č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2) Rozsah dodatečných stavebních prací a méněprací je dán soupisem stavebních prací, který je přílohou změnových listů č. 1 a č. 2.

- 3) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že **cena v rozsahu dodatku č. 1 činí částku ve výši 1.202.728,-Kč** (slovy: jedenmiliondvěstědvatisícsešmdvacet osm korun českých). K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení dodatečných stavebních prací.

Cena za provedení dodatečných prací činí částku ve výši 1.458.804,- Kč.

Cena méněprací činí částku ve výši 256.076,- Kč.

- 4) Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. IV. odst. 1) Smlouvy, které nově zní takto:

Celková cena dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy vč. Dodatku činí částku 130.684.315,- Kč bez DPH.

- 5) Smluvní strany se dohodly, že náležitosti daňového dokladu, jeho doručení a splatnost se řídí Smlouvou (čl. V. Smlouvy).

- 6) Úhrada ceny bude Zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud Zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede Objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl Objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí Zhotovitel bezodkladně Objednateli. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH.

- 7) V souvislosti s výše uvedenými dodatečnými stavebními pracemi, dále v souvislosti s výpadkem dodávky el. proudu v celém areálu dne 12. 9. 2014 a 18. 1. 2015 a s mimořádnými klimatickými podmínkami (silná námraza) dne 2. 12. 2014 se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 1) a odst. 4) písm. c) Smlouvy, které nově zní takto:

čl. II. odst. 1) Zhotovitel se zavazuje, že celková doba provádění díla nepřesáhne 268 kalendářních dnů. Celkovou dobou provádění Díla se pro účely této smlouvy rozumí doba od převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku řádného předání Díla Objednateli, popř. do okamžiku, kdy Objednatel v souladu s touto smlouvou a příslušnými předpisy byl povinen Dílo převzít.

čl. II. odst. 4 písm. c) termín dokončení stavebních prací: do 253 dnů od převzetí staveniště Zhotovitelem (od 27. 8. 2014).

- 8) Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s upraveným časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Upravený harmonogram“).
- 9) Smluvní strany se dohodly, pokud je ve Smlouvě slovo „Harmonogram“ má se od účinnosti tohoto Dodatku na mysli Upravený harmonogram, který je přílohou tohoto Dodatku.
- 10) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto Dodatku řídí Smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 stejnopisy obdrží Zhotovitel.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním plného znění tohoto Dodatku smlouvy tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 Harmonogram prací
 - Změnový list č. 1
 - Změnový list č. 2

Zhotovitel:

V Praze dne 29. 5. 2015



UNISTAV a.s.

Ing. Miroslav Friš, předseda představenstva

Objednatel:

V Praze dne 29. 5. 2015



Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka



Prověřeno právním odd. ČZU v Praze



M. A. Harmon. Stav.		Délka Práci		Zpracování		Indikator Stavby	
		268 dny 27.8.14		21.5.15		15129 481 587,00 Kč	
"Přestavba a modernizace pavilonů "A a B" Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů"							
1	0	Výběr stávající (KPS) - Úložný bod 21. 9. 2014	7 dny	35.9.14	21.9.14	0,00 Kč	
4	7	Odstavení stávající (démolice objektu A-B) - příprava území - Úložný bod 15. 9. 2014	20 dny	27.8.14	15.9.14	0,00 Kč	
6	0	obslužné komunikace a zpev. plochy - Úložný bod 21. 5. 2015	239 dny	25.9.14	21.5.15	0,00 Kč	
6	9	Přípojka splaškové kanalizace - Úložný bod 14. 11. 2014	51 dny	25.9.14	14.11.14	0,00 Kč	
17		Zemní práce - výkop stavební jámy na pilotovad rovinu. Provedení náspů, provedení ochranné vstupy pro pilotáž. - Úložný bod 1. 11. 2014	41 dny	22.9.14	1.11.14	0,00 Kč	
10		Dokončení základových konstrukcí (KPS) - Úložný bod 14. 12. 2014	51 dny	25.10.14	14.12.14	0,00 Kč	
20		betonářské skletu - 1b stěh 1PP včetně 2B stropu - Úložný bod 17. 2. 2015	56 dny	14.12.14	17.2.15	0,00 Kč	
21		betonářské skletu - 1b stěh 1NP + 2NP včetně 2B stropu - Úložný bod 19. 3. 2015	28 dny	20.2.15	19.3.15	0,00 Kč	
22		betonářské skletu - 1b stěh 3NP + 4NP včetně 2B stropu - Úložný bod 7. 4. 2015	27 dny	12.3.15	7.4.15	0,00 Kč	
24		Dokončení hrubé stavby (KPS) - Úložný bod 10. 4. 2015	1 den	10.4.15	10.4.15	0,00 Kč	
26		Střešní plášť včetně klempířských kč (ukončeno zátopovou žloutkou) - Úložný bod 10. 5. 2015	72 dny	28.2.15	10.5.15	0,00 Kč	
29		Realizace fasádního pláště včetně oken, dveří a vrat - Úložný bod 21. 5. 2015	93 dny	18.2.15	21.5.15	0,00 Kč	
33		Řezy pod omítkou 1NP + 2NP - omítky, kanalizace, topení, elektro sítin proud, sítin proud, VZT - Úložný bod 25. 4. 2015	78 dny	7.2.15	25.4.15	0,00 Kč	
36		Montáž trati rozvodů a kabelů: nad podhledem (VZT, chlazení, slno, stázo, voda, topení ...) v 1NP+2NP - Úložný bod 2. 5. 2015	78 dny	14.2.15	2.5.15	0,00 Kč	
40		ukončení všech rozvodů VZT - Úložný bod 5. 5. 2015	91 dny	4.2.15	5.5.15	0,00 Kč	
40		Dokončení vnitřních instalací (KPS) - Úložný bod 10. 5. 2015	86 dny	14.2.15	10.5.15	0,00 Kč	
41		Zprovoznění plynové kotelny - Úložný bod 21. 5. 2015	82 dny	1.3.15	21.5.15	0,00 Kč	
48		Finální podlahy - Úložný bod 21. 5. 2015	83 dny	28.2.15	21.5.15	0,00 Kč	
53		Vybavení laboratorní montáž laboratorní technologie, technických plynů a trubních rozvodů laboratorní - Úložný bod 21. 5. 2015	57 dny	26.3.15	21.5.15	0,00 Kč	
54		Stavební přípravnost pro montáž nábytku 3NP+4NP - samostatná dodávka - Úložný bod 17. 5. 2015	1 den	17.5.15	17.5.15	0,00 Kč	
55		Stavební přípravnost pro montáž nábytku 1PP+1NP+2NP - samostatná dodávka - Úložný bod 16. 5. 2015	1 den	16.5.15	16.5.15	0,00 Kč	
57		Předání podkladů ke kolaudaci - Úložný bod 18.5. 2015	1 den	18.5.15	18.5.15	0,00 Kč	
60		Předání a převzetí stavby - oboustranně podepsaný předání protokol - Úložný bod 21. 5. 2015	1 den	21.5.15	21.5.15	0,00 Kč	
66		Dokončení stavebních prací - Úložný bod 6. 5. 2015	253 dny	27.8.14	6.5.15	0,00 Kč	
66		Předání a převzetí díla - Úložný bod 21. 5. 2015	16 dny	6.5.15	21.5.15	0,00 Kč	
66		vyklizení staveniště - Úložný bod 19. 6. 2015	40 dny	11.5.15	19.6.15	0,00 Kč	
SO 01							
0		Výběr stávající	244 dny	15.9.14	16.5.15	1576 460 945,00 Kč	
7		Zemní práce	7 dny	15.9.14	21.9.14	0,00 Kč	
17		Kotvy záporového pažení	41 dny	22.9.14	1.11.14	788 888,02 Kč	
17		Zaklady	23 dny	3.10.14	25.10.14	141 784 844,07 Kč	
19		Piloty	31 dny	25.10.14	14.12.14	141 504 591,74 Kč	
19		Jezírko	31 dny	25.10.14	14.11.14	141 463 073,23 Kč	
20		Svislé konstrukce	29 dny	27.3.15	24.4.15	15244 444,36 Kč	
20		Komíny	115 dny	14.12.14	7.4.15	756 393,94 Kč	
20		Zai opěrné	59 dny	24.2.15	17.4.15	172 019,03 Kč	
20		Vzduchotechnický kanál	37 dny	10.1.15	15.2.15	15711 833,15 Kč	
20		Anglická dvorky	57 dny	17.1.15	14.3.15	179 270,93 Kč	
20			36 dny	15.1.15	19.2.15	1537 521,20 Kč	

Stavba:

Summary

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projekt: pavilony FAPPZ ČZU v Praze Umístění: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbát	P 7.1.1
--	----------------

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. 1
Příkaz vydal: GLEEDS Česká republika Adresát: Konviktská 30, PRAHA 1 Datum vydání: 18.12.2014	Příkaz převzal: UNISTAV a.s. odpovědná osoba : Jurečka Michal Datum převzetí: 18.12.2014	
PŘEDMĚT ZMĚNY: VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ Referenční dokumentace:		Pořadové číslo Oznámení Změny:
POPIS ZMĚNY: Při hloubení jámy byly objeveny staré železobetonové základy o celkové kubatuře 218,94m ³ . Tyto železobetonové bloky budou pomocí mechanizace rozbity a převezeny na skládku. Důvod Změny:		
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: Odkaz na Přílohu: rozpočet (3 listy) fotodokumentace (4 listy) tabulka- výkaz výměr (1 list)	NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: Doba provedení Změny (dny): 12 dnů Vliv na časové Milníky (dny): 5 dnů Odkaz na Přílohu:	
Doporučení TDS: <i>Provedené práce mají vliv na termín dokončení díla o 5 kalendářních dnů.</i> Datum: 18.12.2014		
Instrukce Objednatele: SCHVÁLENO / NESCHVÁLENO *		
* Důvod neschválení:		
Datum: 18.12.2014		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 001	Záměna těžené zeminy za bourání b	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
Z	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
U4360	ČZU II - FAPPZ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	464 742	Ztížené výrobní podmínky	232
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	481 648	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	14
ZRN celkem		946 390	Zařízení staveniště	9 464
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		946 390	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		956 100	Ostatní náklady celkem	9 710
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		956 100 Kč
DPH		21,0 %		200 781 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 156 881 Kč

Poznámka :

Stavba :	U4360 ČZU II - FAPPZ	Rozpočet :	ZL 001
Objekt :	Z Změnové listy	Záměna téžené zeminy za bourání beton	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	720 818	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	481 648	0
1 Zemní práce	-256 076	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	464 742	0	0	481 648	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,1	464 742	232
Oborová přírážka	0	0,0	464 742	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	464 742	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	464 742	14
Zařízení staveniště	0	1,0	946 390	9 464
Provoz investora	0	0,0	946 390	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	946 390	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	946 390	0
CELKEM VRN				9 710

Položkový rozpočet

Stavba :	U4360 ČZU II - FAPPZ	Rozpočet: ZL 001
Objekt :	Z Změnové listy	Záměna těžené zeminy za bourání betonu v základech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	218,94	3 292,25	720 818,38
		2,548+3,15+3,15+2,548+1,521+12,012+20,16- 2,16+36,288+5,70+9,60+1,764+4,872+5,76+22,308+4,032+9,048		142,30		
		14,112+10,044+4,464+5,187+4,836		38,64		
		8,00+8,00+4,00+4,00+1,00+1,00+6,00+6,00		38,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				720 818,38
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	525,47	210,21	110 458,12
		218,944*2,40		525,47		
3	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	525,47	16,93	8 896,13
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 50m	t	525,47	159,90	84 021,95
5	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 20 km	t	525,47	249,99	131 361,15
6	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m celkem do 20 km chybi 14x525,4656	t	7 356,58	19,97	146 910,90
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				481 648,25
Díl: 1		Zemní práce				
7	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	-218,94	259,50	-56 815,97
		-(2,548+3,15+3,15+2,548+1,521+12,012+20,16- 2,16+36,288+5,70+9,60+1,764+4,872+5,76+22,308+4,032+9,048)		-142,30		
		-(14,112+10,044+4,464+5,187+4,836)		-38,64		
		-(8,00+8,00+4,00+4,00+1,00+1,00+6,00+6,00)		-38,00		
8	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	-218,94	22,10	-4 838,66
9	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	-218,94	260,50	-57 034,91
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m mez	m3	-218,94	34,00	-7 444,10
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m celkem 20 km	m3	-218,94	248,50	-54 407,58
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 5x218,9440	m3	-1 094,70	20,50	-22 441,35
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-218,94	242,50	-53 093,92
	Celkem za	1 Zemní práce				-256 076,49

foto A - obj.B			
a(m)	b(m)	c(m)	m3
1,4	1,4	1,3	2,548
1,5	1,5	1,4	3,15
1,5	1,5	1,4	3,15
1,4	1,4	1,3	2,548

foto B - obj.B			
a(m)	b(m)	c(m)	m3
0,9	1,3	1,3	1,521

foto C - obj.B			
a(m)	b(m)	c(m)	m3
7,7	1,2	1,3	12,012

foto D - obj.B			
a(m)	b(m)	c(m)	m3
2,1	2,4	4	20,16
3,6	2	0,3	-2,16

foto E - obj.B			
a(m)	b(m)	c(m)	m3
4,2	2,7	3,2	36,288

foto F - obj.B			
a(m)	b(m)	c(m)	m3
2	1,9	1,5	5,7
2,5	2,4	1,6	9,6
1,4	0,9	1,4	1,764
2,9	1,4	1,2	4,872

foto G - obj.B			
a(m)	b(m)	c(m)	m3
3	1,6	1,2	5,76

foto H - obj.B			
a(m)	b(m)	c(m)	m3
2,6	2,2	3,9	22,308

foto I - obj.B			
a(m)	b(m)	c(m)	m3
1,4	2,4	1,2	4,032

foto J - obj.B			
a(m)	b(m)	c(m)	m3
5,8	1,2	1,3	9,048

142,30

foto K - obj.A			
a(m)	b(m)	c(m)	m3
8,4	1,2	1,4	14,112
3,1	2,7	1,2	10,044
3,1	1,2	1,2	4,464
2,1	1,9	1,3	5,187

foto L - obj.A			
a(m)	b(m)	c(m)	m3
3,1	1,3	1,2	4,836
			38,643


foto M - kolektor			
a(m)	b(m)	c(m)	m3
25	1,6	0,2	8
25	1,6	0,2	8
25	0,8	0,2	4
25	0,8	0,2	4
25	0,2	0,2	1
25	0,2	0,2	1
25	0,4	0,6	6
25	0,4	0,6	6
			38

Spolu
218,94







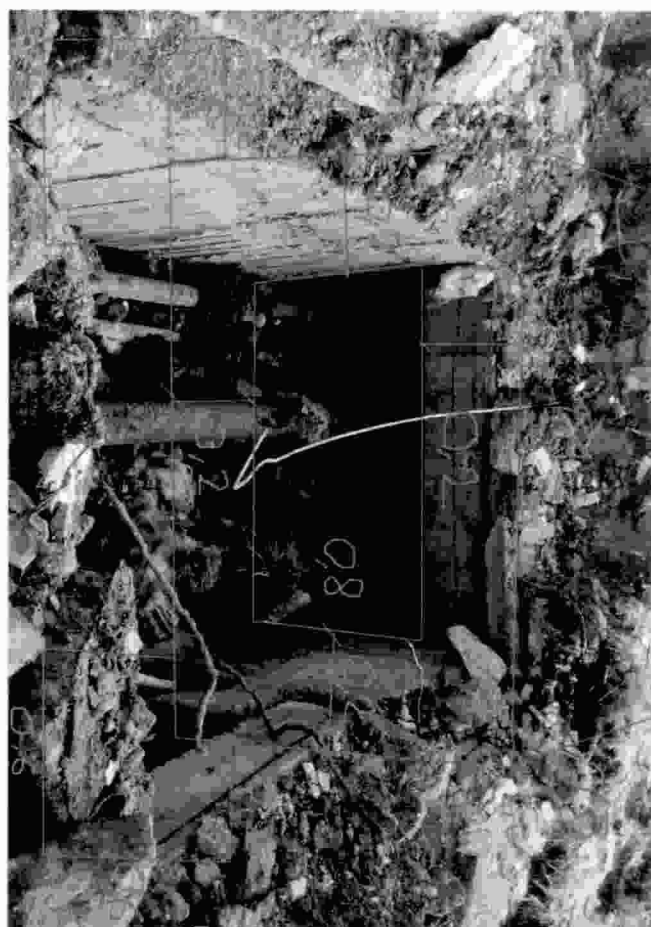

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze Projekt: pavilony FAPPZ ČZU v Praze Umístění: Kamýčká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbát	P 7.1.1
--	----------------

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		POŘADOVÉ Č. 2
Příkaz vydal: GLEEDS Česká republika Adresát: Konviktská 30, PRAHA 1 Datum vydání: 18.12.2014	Příkaz převzal: UNISTAV a.s. Odpovědná osoba – Jurečka Michal Datum převzetí: 18.12.2014	
PŘEDMĚT ZMĚNY: PŘELOŽKA VYSOKÉHO NAPĚTÍ Referenční dokumentace:		Pořadové číslo Oznámení Změny:
POPIS ZMĚNY: Původní kabel VN byl situován jinde než bylo uvedeno v projektu. Z tohoto důvodu bylo nutno provést „roztřelení“ kabelu a provést spojky. Nově prodloužený kabel byl uložen do betonových žlabů Důvod Změny:		
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY: Odkaz na Přílohu: rozpočet (4 listy) – 298.420,- Kč	NÁVRH DOPADU NA DOBU TRVÁNÍ DÍLA: Doba provedení Změny (dny): 14 dnů Vliv na časové Milníky (dny): 2 dny Odkaz na Přílohu:	
Doporučení TDS: <i>Provedené práce mají vliv na termín dokončení díla o 2 kalendářní dny. Fakturace bude provedena podle skutečně provedených prací</i> Datum: 18.12.2014 Vondra Vladislav _____ Jméno / Podpis		
Instrukce Objednatel: SCHVÁLENO / NESCHVÁLENO * * Důvod neschválení: Datum: 18.12.2014 Jeřábek František _____ Jméno / Podpis		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 002	Přeložka VN s chodníkem	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
Z	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
U4360	ČZU II - FAPPZ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	104 586		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	121 778		
N	M dodávky celkem	20 264		
ZRN	celkem	246 628		
	HZS	0		
ZRN+HZS		246 628	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		246 628	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		246 628 Kč
DPH		21,0 %		51 792 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				298 420 Kč

Poznámka :

Stavba : U4360 ČZU II - FAPPZ
 Objekt : Z Změnové listy

Rozpočet : ZL 002
 Přeložka VN s chodníkem

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	25 826	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	48 712	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 648	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	20 264	102 278	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	19 500	0
VN Vedlejší náklady	14 400	0	0	0	0
GELKEM OBJEKT	104 586	0	20 264	121 778	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	U4360 ČZU II - FAPPZ	Rozpočet: ZL 002
Objekt :	Z Změnové listy	Přeložka VN s chodníkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	1-01	Vykopání rýhy 60/120 vč.pískového lože a záhozu	m	42,00	153,50	6 447,00
2	1-04	Pískové lože	m	42,00	79,00	3 318,00
3	113107130U00	Odstraň podklad -50m2 beton tl 10cm	m2	29,40	452,00	13 288,80
		42,00*0,70		29,40		
4	174101101	Zásyp zhutněný kolem objektů ve vykopávkách	m3	21,84	79,00	1 725,36
		42*0,60*1,20-42,00*0,20		21,84		
5	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	30,00	34,90	1 047,00
	Celkem za	1 Zemní práce				25 826,16
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
6	919735112R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	84,00	67,20	5 644,80
7	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	84,00	311,00	26 124,00
8	916231213	Osazení chodník obrub B stoj opěra C 25/30	m	30,00	225,15	6 754,50
9	564861113	Podklad šterkodrtě ŠDA 0-63 tl po zhutnění 22cm	m2	25,20	134,30	3 384,36
		42,00*0,60		25,20		
10	577143111U00	Asf beton obrus ACO8 tl 50mm -3m	m2	25,20	270,00	6 804,00
		42,00*0,60		25,20		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				48 711,66
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
11	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	12,50	108,00	1 349,46
		asfalt: 42,00*0,70*0,10*2,4		7,06		
		beton, podklad: 5,439		5,44		
12	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	5,44	249,99	1 359,70
13	979083519R00	Příplatek za dalších 1000 m nad 6000 m za dalších 14 km + 12 km objížďka	t	141,41	19,97	2 824,04
		5,439*(14+12)		141,41		
14	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	5,44	312,00	1 696,97
15	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	7,06	1 193,00	8 417,81
		asfalt: 42,00*0,70*0,10*2,4		7,06		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				15 647,97
Díl: M21		Elektromontáže				
16	210930102X	Montáž hliníkových kabelů AXEKCY	m	260,00	21,00	5 460,00
17	210930103V1	Kabel silový AXEKVCEY 22kV 1x120/16 mm2 volně uložený	m	30,00	146,52	4 395,60
18	210950101X	Další štítek označovací na kabel	ks	4,00	9,06	36,24
19	000105031X	Štítek kabelový s tiskem	ks	4,00	3,12	12,48
20	210950111X	Svazkování jednoduchých kabelů	ks	6,00	5,54	33,24
21	000106265X	Řemínek upevňovací	ks	6,00	1,44	8,64
22	210100001X	Střílení kabelů VN, fázování	ks	2,00	3 600,00	7 200,00
23	210280001X	Zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací	kpl	1,00	5 124,00	5 124,00
		do 100.000,- Kč				
24	210280002	Inženýrská činnost při realizaci stavby	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
		do 100.000,- Kč				
25	28324628X	Spojka přímá smrštitelná CHM 24/70-240 22kV	kus	12,00	1 642,66	19 711,92
26	35432351X	Spojka kabelová lisovací vodiče Al kruhové 120 mm2	kus	12,00	45,97	551,64
27	210000110X	Připojení do sítě VN 2 x spojkou	sada	2,00	33 720,00	67 440,00
28	01	Revize	hod	4,00	1 500,00	6 000,00
29	02	Nespecifikované práce HZS příkazy B (dle SUB)	hod	4,00	392,00	1 568,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				122 541,76
Díl: M99		Ostatní práce "M"				
30	99000001	Projektová dokumentace	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
31	99000002	Geodetické zaměření-7 geod.bodů	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	U4360 ČZU II - FAPPZ	Rozpočet: ZL 002
Objekt :	Z Změnové listy	Přeložka VN s chodníkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	99000003	Měření PRE - 2 najížděcí dny	kpl	1,00	9 200,00	9 200,00
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				19 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
33	VRN01	Identifikace a zkoušky kabelů VN	Soubor	1,00	14 400,00	14 400,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				14 400,00
