

13. 12. 2016

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 1. 2016
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. **Objednatel** **Česká zemědělská univerzita v Praze**
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 19-500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. **Zhotovitel:** **Zlínstav a.s.**
Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupený: Markem Podzemným, místopředsedou představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Morávek, ředitel SZ 04
bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.: 117259673/0300
IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 184
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále jen „smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 22. 1. 2016, jejímž předmětem je realizace stavby „**ČZU – Centrum ekonomicko-manažerských studií – 2. část**“ (dále jen „smlouva“).

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu nutnosti provedení víceprací a méněprací dohodly, že v rámci předmětu smlouvy je nutno provést nad sjednaný rámec práce či neprovádět práce ve smlouvě sjednané, které jsou definované obsahem změnových listů č. 20, 36, 39, 40, 47-49, 51, 52, 54-56, 58-60, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „vícepráce“).
2. Rozsah dohodnutých méněprací a víceprací: dle soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb vzniklých v průběhu realizace stavby, viz příložené změnové listy č. 20, 36, 39, 40, 47-49, 51, 52, 54-56, 58-60 (příloha č. 1 tohoto dodatku).
3. Zhotovitel se zavazuje výše uvedené vícepráce provést v termínech dle smlouvy.

4. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení víceprací dle odst. 1 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 951.459,- Kč bez DPH (slovy: devětsetpadesátjednatřicetčetřístapadesátdevět korun českých).

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné méněpráce dle odst. 1 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 191.705,- Kč bez DPH (slovy: jednostodevadesátjednatřicetšedmsetpět korun českých).

Cena díla uvedená ve smlouvě tedy činí 146.367.840,- Kč bez DPH (slovy: jednočtyřicetšestmilionůtřistašedesátšedmsetčtyřicet korun českých).

5. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.
6. V souvislosti s výše uvedenými dodatečnými stavebními pracemi se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 1 smlouvy, které nově zní takto:
Čl. II. odst. 1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí díla) do 15 měsíců a 3 dnů od předání staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínu pro předání a převzetí díla tak bude mít za následek vznik škody do výše dotace, kterou by objednatel v případě splnění termínu pro předání a převzetí díla obdržel.
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s upraveným časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, ve kterém jsou upraveny časově i věcně významné milníky postupu provedení díla, a který je v souladu s novým termínem pro dokončení díla uvedeným v odst. 6 tohoto článku, a to ode dne účinnosti tohoto dodatku.
8. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí smlouvou.

III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana bdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být v rámci poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o technické kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající z tohoto zákona jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Tento dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a platnosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za provedení víceprací dle odst. 1 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 951.459,- Kč Kč bez DPH (slovy: devětsetpadesátjednatřicetčetřistapadesátdevět korun českých).

Smluvní strany se dohodly, že cena za neprováděné méněpráce dle odst. 1 tohoto článku dodatku činí částku ve výši 191.705,- Kč bez DPH (slovy: jednostodevadesátjednatřicetsetmsetpět korun českých).

Cena díla uvedená ve smlouvě tedy činí 146.367.840,- Kč bez DPH (slovy: jednočtyřicetšestmilionůtřistašedesátsetmsetčtyřicet korun českých).

5. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné provedení víceprací.
6. V souvislosti s výše uvedenými dodatečnými stavebními pracemi se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 1 smlouvy, které nově zní takto:
Čl. II. odst. 1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude provedeno (včetně předání a převzetí díla) do 15 měsíců a 3 dnů od předání staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínu pro předání a převzetí díla tak bude mít za následek vznik škody do výše dotace, kterou by objednatel v případě splnění termínu pro předání a převzetí díla obdržel.
7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s upraveným časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, ve kterém jsou upraveny časově i věcně významné milníky postupu provedení díla, a který je v souladu s novým termínem pro dokončení díla uvedeným v odst. 6 tohoto článku, a to ode dne účinnosti tohoto dodatku.
8. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí smlouvou.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku a smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- 1) ZL č. 20, 36, 39, 40, 47-49, 51, 52, 54-56, 58-60
- 2) Upravený časový harmonogram postupu provedení díla

V Praze dne: 14 -12- 2016


Za objednatele:



.....
Ing. Jana Vohralíková
kvestorka

V Praze dne: 14 -12- 2016

Za zhotovitele:



.....
Marek Podzemný
místopředseda představenstva



Prověřeno právním odd. ČZU v Praze
mil

Evidenční list změny stavby

číslo a evidenční číslo stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby

číslo stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií

doplnění izolace a odhlučněního potrubí

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 01 /

Číslo změny stavby:

20

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

POS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

1) Změnový rozpočet s doplněním izolace a souvisejících prací - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ bylo zjištěno, že výkaz výměr k SOD neobsahuje izolaci nitřního dešťového kanalizačního potrubí proti rosení a dále GP doplnil výměry odhlučněního odpadního kanalizačního potrubí.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 551,00	0,00%	73 878,64	0,051%	72 327,64

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	13.10.2016	podpis
POS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	13.10.2016	podpis
	jméno	Vladislav Vondra	datum	13.10.2016	podpis
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	13.10.2016	podpis
	jméno	Jiří Hruška	datum	13.10.2016	podpis
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing.Miloslava Jungmannová	datum	13.10.2016	podpis
	jméno	Ing. Josef Kůrka	datum	13.10.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby				
Stavební objekt, Inženýrský		ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - KANALIZACE			číslo SO, PS	
číslo položky	zařídění položky	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)	
					jednotková cena	cena položky
		713 - Zdravotechnika - tepelné izolace			67 299,75 Kč	
1	713463211U00 URS 2016	Izol tep potrubí pouze Al fol+pás-50 17+2	m	19,00	51,70	982,30
2	713463212U00 URS 2016	Izol tep potrubí pouze Alfol+pás-100 18+15	m	33,00	57,80	1 907,40
3	713463213U00 URS 2016	Izol tep potrubí pouze Alfol+pás-150 158+49,5	m	207,50	67,60	14 027,00
4	713463214U00 URS 2016	Izol tep potrubí pouze Alfol+pás150- 32+28	m	60,00	71,90	4 314,00
5	63154512 RTS 2016	Pouzdro potrubní izolační ALS 35/25 mm 17*1,05	m	17,85	72,59	1 295,73
6	63154514 RTS 2016	Pouzdro potrubní izolační ALS 49/25 mm 2*1,05	m	2,10	79,91	167,81
7	63154515 RTS 2016	Pouzdro potrubní izolační ALS 60/25 mm 18*1,05	m	18,90	87,11	1 646,38
8	63154518 RTS 2016	Pouzdro potrubní izolační ALS 89/25 mm 15*1,05	m	15,75	105,77	1 665,88
9	63154521 RTS 2016	Pouzdro potrubní izolační ALS 114/25 mm 158*1,05	m	165,90	126,27	20 948,19
10	63154522 RTS 2016	Pouzdro potrubní izolační ALS 133/25 mm 49*1,05	m	51,45	139,08	7 155,67
11	63154525 RTS 2016	Pouzdro potrubní izolační ALS 168/25 mm 32*1,05	m	33,60	167,75	5 636,40
12	63154547 RTS 2016	Pouzdro potrubní izolační ALS 219/30 mm 28*1,05	m	29,40	234,24	6 886,66
998725203		Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	666,33414	1,00 Kč	666 Kč
		721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			3 578,43 Kč	
721-1-03		Připojovací a odpadní potrubí - plastový kanalizační systém HT-PP, včetně tvarovek a upevnění (splašková kanalizace, kondenzát od VZT jednotek) O50	m	-3	132 Kč	-396,00 Kč
721-1-04		Připojovací a odpadní potrubí - plastový kanalizační systém HT-PP, včetně tvarovek a upevnění (spláškovaná kanalizace, kondenzát od VZT jednotek) O75	m	-7	165 Kč	-1 155,00 Kč
721 17-5103 URS 2016		POLO-KAL Připojovací a odpadní potrubí - plastový kanalizační systém, včetně tvarovek a upevnění (spláškovaná kanalizace, kondenzát od VZT jednotek) zvuk tlumící O50	m	3	417 Kč	1 251,00 Kč
721 17-5104 URS 2016		POLO-KAL Připojovací a odpadní potrubí - plastový kanalizační systém, včetně tvarovek a upevnění (spláškovaná kanalizace, kondenzát od VZT jednotek) zvuk tlumící O75	m	7	549 Kč	3 843,00 Kč
998721203		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	35,43	1,00 Kč	35,43 Kč
CELKEM					70 878,18	
Vedlejší a ostatní náklady					1 449,46	
poměrná část dle SOD						
CELKEM bez DPH					72 327,64	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií SO 028 - Rozšíření vstup.dveří a doplnění žaluzií AI05 a Změna hliníkových stěn AID 12 a Ali 24 s PO na bez PO	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 01 /</p>	Číslo změny stavby: <p style="font-size: 24pt;">36</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet s dle IS 028 - Rozšíření vstupních dveří a doplnění žaluzií k AI05 a souvisejících prací - rozpočet
- 2) Revize PD

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ byl zjištěn rozpor mezi stavební částí a PBR v tom, že dveře neumožňovaly dostatečný profil pro přívod vzduchu při požáru. Rozšíření vstupních dveří a změna dveří AI 19 a Ali 11, dále byly doplněny žaluzie k oknu AI 05. Z téhož důvodu musely být doplněny ke dveřím AID 10 panikové hrazdy na obou křídlech, dveře AI 19 byly doplněny o panikové hrazdy na obou křídlech + nápis, dveře Ali 11 byly osazeny elektromechanickými zámky pro funkčnost čteček a panikové hrazdy na obou křídlech. GP vydal revizi hliníkových výrobků, kde bylo upuštěno od realizace vnitřní hliníkové stěny Ali 24 s požární odolností na provedení bez požární odolnosti. Rovněž tak není nutné provést hliníkové dveře AID 12 s horním a bočním nadsvětlíkem v provedení s požární odolností.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

ANO - pozice AI 19 a AID 10 budou vyjmuty z milníku č.8.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-28 702,00	-0,02%	293 596,53	0,204%	264 894,53

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO POLS R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	15.11.2016	podpis
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	15.11.2016	podpis
	jméno	Vladislav Vondra	datum	15.11.2016	podpis
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	15.11.2016	podpis
	jméno	Jiří Hruška	datum	15.11.2016	podpis
Objednavatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	15.11.2016	podpis
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	15.11.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Název stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby					
Stavební		IS 028 - Rozšíření a doplnění vstupních dveří + doplnění žaluzií AI05					
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR							
číslo položky	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace položky (místopis)	poznámky
				jednotková cena	cena položky		
Díl: 767	Konstrukce zámečnické						
POZICE ALI11 (Ali 11.2)							
27	M76-744	Ali/11 sestava s dveřmi vnitřní, rozměr /5625x3280/	kus	1,00			dle tabulky oken
		panikové hrazdy na obou křídlech (klikka z venkovní strany pro volný průchod osob)	kompl	1,00		37 498,00	
		Panikový zámek s protikusem		1,00	3 840,00		
		Panikové kování na obě křídla	kompl	1,00	29 373,00		
		Mechan. Pk smart-cern – držák panikové hrazdy		1,00			
		Hrazda paniková		2,00			
		Madlo paniky		2,00			
		Svislá viditelná zástrč pasivního křídla		1,00			
		montáž		1,00	4 285,00		
POZICE ALD10							
55	M76-741	AID/10 dveře s nadvětlíkem, sestava, rozměr /2700x3170/	kus	1,00			dle tabulky oken
		panikové hrazdy na obou křídlech + osazení elektromechanického zámku pro případné budoucí osazení čteček na pravé dveřní křídlo při pohledu z exteriéru	kompl	1,00		52 333,00	
		EL 460 zámek samozamykací (pravé dveřní křídlo) – pro případnou budoucí funkci čteček		1,00	14 835,00		
		Panikový zámek s protikusem (levé dveřní křídlo)		1,00	3 840,00		
		Panikové kování na obě křídla	kompl	1,00	29 373,00		
		Mechan. Pk smart-cern – držák panikové hrazdy		1,00			
		Hrazda paniková		2,00			
		Madlo paniky		2,00			
		montáž		1,00	4 285,00		
POZICE AL19 (Ali 19.4)							
58	M76-713	Ali/19 okenní sestava, rozměr /8850x3160/	kus	1,00			dle tabulky oken
		osazení elektromechanickými zámkami pro funkčnost čteček, panikové hrazdy na obou křídlech + nápis	kompl	1,00		103 145,00	
		PE923 pasive set 3500 zámek samozamykací – pro funkčnost čteček		1,00	17 192,00		
		PE420/35/24 active set zámek samozamykací – pro funkčnost čteček		1,00	35 200,00		
		EA219 kabel vč příslušných koncovek - pro funkčnost čteček		2,00	1 290,00		
		10314-20 průchodka nerezová - pro funkčnost čteček		2,00	2 250,00		
		Panikové kování na obě křídla	kompl	1,00	29 373,00		
		Mechan. Pk smart-cern – držák panikové hrazdy		1,00			
		Hrazda paniková		2,00			
		Madlo paniky		2,00			
		Svislá viditelná zástrč pasivního křídla		1,00			
		Nápis ve fólii		1,00	3 900,00		
		montáž		1,00	10 400,00		
ŽALUZIE na pozici AL05							
16	M76-702	AI/05 okenní sestava, rozměr /2800x2250/ EI30DP1	kus	7,00			dle tabulky oken dle revize 06
		Dodávka a montáž - žaluzií	kus	28,00	3 404,00	95 312,00	
57	M76-743	AID/12 dveře s nadvětlíkem, sestava, rozměr /2800x3100/ EI30DP1	kus				Stanovisko GP revize PBŘS
57a	M76-743	AID/12 dveře s nadvětlíkem, sestava, rozměr /2800x3100/ bez PO	kus	-1,00	11 740,00	-11 740,00	
		sleva za provedení dveří s nadvětlíkem bez požární odolnosti					
67	M76-753	Ali/24 sestava s dveřmi vnitřní, rozměr /4675x3250/ EW30DP3	kus				Dotazy č. 9 Hliník.výplně, dotaz č. 14
7a	M76-753	Ali/24 sestava s dveřmi vnitřní, rozměr /4675x3250/ bez PO	kus	-1,00	16 962,00	-16 962,00	
		sleva za provedení sestavy s dveřmi bez požární odolnosti					
CELKEM bez DPH					259 586,00		
Vedlejší a ostatní náklady					5 308,53		
poměrná část dle SOD							
CELKEM bez DPH					264 894,53		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií Upřesnění realizace zateplení stropu 1.PP a hyg.doplňků	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">39</div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s odpočtem nerealizovaných prací a dodávek - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ bylo upřesněna výměra tepelné izolace stropů a dodávka a montáž malých osoušečů a madel pro invalidy. Nerealizované práce a dodávky se odčítají.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-128 671,00	-0,09%	0,00	0,000%	-128 671,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	22.9.2016	podpis
TDS:Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	22.9.2016	podpis
	jméno	Vladislav Vondra	datum	22.9.2016	podpis
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	22.9.2016	podpis
	jméno	Jiří Hruška	datum	22.9.2016	podpis
Objednavatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing.Miloslava Jungmannová	datum	22.9.2016	podpis
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	22.9.2016	podpis

ento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

jméno stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby				číslo SO, PS	SO01		
Stavební objekt,		Upřesnění realizace zateplení stropu 1. PP a hyg.doplnků				SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR			
číslo položky	y	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky	
					jednotková cena	cena položky			
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní						-119 886,60	
5	622 31-1731.VL1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 80 mm se systémovou stěrkou	m2	-130,57	674,96	-88 132,23	strop nad 1PP	Dotazy č.7 Zateplení stropu, dotaz č. 13	
6	622 39-1001.R00	Příplatek-mtž KZS pohledu,izolant tenkovrst.om. Dle SOD :210,1 Dle PD : m.č. 0.33 - 7.04*8,3 Dle PD : m.č. 0.36 - 5,74*3,675	m2	-130,57 -210,1 58,43 21,094	236,72	-30 909,48	strop nad 1PP		
Díl: 99	998 01-2023.R00	Staveništní přesun hmot				-422,45			
1	CS RTS	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	-3,27	129,00	-422,45			
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				-5 783,36			
24	R95 21-19	X10.a madla - kabina WC pro handicap. - dle vyhl. č. /398/2009 Sb. Dle SOD :8 Dle PD : 4	kus	-4,00	1 445,84	-5 783,36	dle Tabulky ostatních výrobků	Dotazy č. 8 Invalidní madla, dotaz č. 8	
CELKEM bez DPH						-126 092,41			
Vedlejší a ostatní náklady						-2 578,59			
poměrná část dle SOD									
CELKEM bez DPH						-128 671,00			

Evidenční list změny stavby

název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 04 - Úprava vsakování S 025 - Úprava vsakování	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">IO 04 /</p>	Číslo změny stavby: <p style="font-size: 24pt;">40</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Zhotovitel: Zlínstav a.s.
DS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet s vyčleněním úpravy vsakování a souvisejících prací - rozpočet
- 2) Projektová dokumentace

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:
 / průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ na základě požadavku uživatele a nad rámec PD bude proveden nový objekt IO 04 - Úprava vsakování dle nově předané PD. Ze zkušenosti objednatel vyplývá, že i vsak navržený podle ČSN je v některých případech (krátkodobé přivalové deště) nedostatečný. Vzhledem k možné významné shodě při zaplavení objektu, objednatel volí toto zajištění nad rámec obvyklého řešení.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: ANO - vliv na posunutí milníku č. 1 z 14.3.2017 na 30.3.2017

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	101 027,02	0,070%	101 027,02

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO POLS R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	15.11.2016	podpis
DS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	15.11.2016	podpis
	jméno	Vladislav Vondra	datum	15.11.2016	podpis
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	15.11.2016	podpis
	jméno	Jiří Hruška	datum	15.11.2016	podpis
Objednavatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing.Miloslava Jungmannová	datum	15.11.2016	podpis
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	15.11.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

název stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016-063a
Stavba: CEMS II - ČZU Praha

JKSO:
Místo: Kamýcká 129, Praha Suchdol

CC-CZ:
Datum: 10.8.2016

Objednatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Miroslav Kmínek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miroslav Kmínek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	101 027,02
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 101 027,02

DPH základní	21,00%	ze	101 027,02	21 215,67
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** 122 242,69

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016-063a

Stavba: CEMS II - ČZU Praha

Místo: Kamýcká 129, Praha Suchdol

Datum:

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Miroslav Kmínek

Zhotovitel:

Zpracovatel: Miroslav Kmínek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	101 027,02	122 242,69
IO 04	VSAKOVACÍ OBJEKT DEŠŤOVÝCH VOD ZE SVAHU	101 027,02	122 242,69
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		101 027,02	122 242,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CEMS II - ČZU Praha

Objekt: IO 04 - VSAKOVACÍ OBJEKT DEŠŤOVÝCH VOD ZE SVAHU

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel:

Projektant:

Miroslav Kmínek

Zpracovatel:

Miroslav Kmínek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				99 002,42
Ostatní náklady + vedlejší náklady				2 024,60
Cena bez DPH				101 027,02
DPH základní	21,00%	ze	101 027,02	21 215,67
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	122 242,69

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE

Stavba: CEMS II - ČZU Praha

Objekt: IO 04 - VSAKOVACÍ OBJEKT DEŠŤOVÝCH VOD ZE SVAHU

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant:

Miroslav Kmínek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Miroslav Kmínek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	99 002,42
HSV - Práce a dodávky HSV	99 002,42
8 - Trubní vedení	92 904,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 153,10
998 - Přesun hmot	945,21
2) Ostatní náklady	2 024,60
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	101 027,02

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: CEMS II - ČZU Praha

Objekt: IO 04 - VSAKOVACÍ OBJEKT DEŠŤOVÝCH VOD ZE SVAHU

Místo:

Datum:

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant:

Miroslav Kmínek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Miroslav Kmínek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 002,42

HSV - Práce a dodávky HSV

99 002,42

8 - Trubní vedení

92 904,11

16	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	8,000	536,00	4 288,00
18	K	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	kus	1,000	3 090,00	3 090,00
19	M	M001	Horská vpust 1500x880x1640	soubor	1,000	4 740,00	4 740,00
20	M	M002	mříž kompozitní 1383x770	kus	1,000	3 260,00	3 260,00
21	K	895972113	Zasakovací box z polypropylenu PP s revizí pro vsakování jednořadová galerie objemu do 20 m3 vč zemních prací	soubor	1,000	77 526,11	77 526,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 153,10

22	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	15,000	94,10	1 411,50
23	M	M003	Žlabovka TBZ 50/65/16	kus	30,000	124,72	3 741,60

998 - Přesun hmot

945,21

24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,503	70,00	945,21
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	--------

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií SO 029 - Doplnění 3 ks svítidel ve vstupní markýze	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 01 /</p>	Číslo změny stavby: <p style="text-align: center; font-size: 24pt;">47</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

DS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet s přípočtem 3 kusů svítidel a souvisejících prací - rozpočet
- 2) IS 029 - Doplnění svítidel

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

opis a zdůvodnění změny:

průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ na základě požadavku objednatele budou do vstupní markýzy osazeny 3 kusy nových svítidel.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-91,70	0,00%	16 012,97	0,011%	15 921,27

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO OL.S.R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	27.9.2016	podpis
S:Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	27.9.2016	podpis
	jméno	Vladislav Vondra	datum	27.9.2016	podpis
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	27.9.2016	podpis
	jméno	Jiří Hruška	datum	27.9.2016	podpis
Objednavatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing.Miloslava Jungmannová	datum	27.9.2016	podpis
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	27.9.2016	podpis

o Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Název stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
Stavební objekt, Inženýrský objekt,		IS 029 - Doplnění 3 ks svítidel do vstupní markýzy		číslo SO, PS		S001		
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky	číselné zařazení	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
2.		Instalační přístroje a svítidla						
2.1.12		Vypínač, řazení 1, kompletní včetně rámečku	kpl	1,00	92,60	92,60 Kč		
2.2.28		P - PN 230 LED, 144203, vstupní markýza	ks	3,00	4 937 Kč	14 811,00 Kč	Svítidla nad vstup do budovy	
3.		Kabely a kabelové trasy						
3.1.17		Kabel CXKH-R 3x1,5					Množství určeno z výšky jednotlivých podlaží a průběhu kabeláže přes tato podlaží dle části 01-13 výkresové dokumentace	
8.		Instalace						
8.1		Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku)	kpl	-1,00	38 Kč	-37,64 Kč		
8.3		Instalace osvětlení	kpl	1,00	761,86	761,86 Kč		
8.4		Instalace koncových prvků	kpl	1,00	28 Kč	28,45 Kč		
CELKEM						15 602,21		
Vedlejší a ostatní náklady						319,07		
poměrná část dle SOD								
CELKEM bez DPH						15 921,27		

Poznámka

V prováděcí projektové dokumentaci je vyprojektován přívodní kabel k nápisu a ke světlům nad vstupem do budovy. Je to jeden okruh, tedy to co napájí nové 3 ks svítidel a má napájet i ten nápis (kdyby byl světelný, obsahoval zdroje světla, atd.).

Projekt ani neřeší jak a čím se bude osvětlení spínat (to nad vchodem) a ani neřeší jak se bude zapínat osvětlení nápisu (předpokládalo se, že vlastní nápis bude obsahovat zdroje světla, nějaké LED, atd..) Odpočet pro přípravu na osvětlení nápisu cca 3m kabelu CXKH-R 3x1,5 . K tomu by se připočítá vypínač, který se bude zapínat osvětlení nad vchodem (ty 3 světla).

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií IS 013 - Rozšíření vzduchové dveřní clony	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center;">SO 01 /</p>	Číslo změny stavby: <p style="font-size: 24pt;">48</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Objednavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet s vyčíslením rozšíření dveřní clony - rozpočet	Počet paré: Příjemce : <p style="text-align: right;">1 x Objednatel</p> <p style="text-align: right;">1 x TDS</p> <p style="text-align: right;">1 x Zhotovitel</p> <p style="text-align: right;">1 x Projektant (autorský dozor)</p>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popis a zdůvodnění změny:

L.č.48 souvisí se ZL č.36. V průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ bude provedena úprava velikosti clony z 2 000mm na 2 500mm. Změna je z důvodu nesouladu se šířkou otevírání dveří pro účel požárního ovládní

Asový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	14 990,41	0,010%	14 990,41

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO OLS R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	25.10.2016	podpis
S:Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	25.10.2016	podpis
	jméno	Vladislav Vondra	datum	25.10.2016	podpis
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	25.10.2016	podpis
	jméno	Jiří Hruška	datum	25.10.2016	podpis
Objednavatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing.Miloslava Jungmannová	datum	25.10.2016	podpis
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	25.10.2016	podpis

Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Název stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Stavba		Vzduchotechnika - rozšíření dveřní clony				číslo SO, PS	5001
Stavební objekt, Inženýrský objekt,		SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR					
číselné zařazení položky	popis položky	měrná jednotka a	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)	č.m.	přesná identifikace polohy (místopost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
číslo položky	Cenová soustava			jednotková cena			
Zařízení 112 – Dveřní clona							
112.01 DC	Příplatek za navýšení délky dveřní clony z 2,0 m na 2,5 m	kpl	1,00	14 690 Kč	14 690 Kč	č.m. 1.04, 1.NP	
	Celkem dodávka zařízení 112				14 690 Kč		
	Montáž zařízení 112 - bez navýšení	kpl	1,00	0 Kč	0 Kč		
	Celkem				14 690,00		
Vedlejší a ostatní náklady					300,41		
poměrná část dle SOD							
GELKEM bez DPH					14 990,41		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby Stav stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií Obsah a rozsah provedení SDK předstěny Wi 4.3	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">49</h1>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
 Zhotovitel: Zlínstav a.s.
 Projektant: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:
 1) Změnový rozpočet s upřesněním provedení SDK předstěny Wi 4.3 a souvisejících prací - rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:
 Během průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ bylo zjištěno, že výkaz výměr k SOD se liší v provedení SDK předstěny Wi 4.3 s technickými pokyny na realizaci předstěny výška 4 m v posluchárnách. Bylo oceněno zhuštění nosných profilů předstěny.

Průběhový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	6 988,10	0,005%	6 988,10

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO POLS.R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	2.11.2016	podpis
Projektant: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	2.11.2016	podpis
	jméno	Vladislav Vondra	datum	2.11.2016	podpis
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	2.11.2016	podpis
	jméno	Jiří Hruška	datum	2.11.2016	podpis
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing.Miloslava Jungmannová	datum	2.11.2016	podpis
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	2.11.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Název stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby

Stavba		číslo SO, PS		SO01				
Stavební objekt, Inženýrský objekt, Provozní soubor		Upřesnění provedení SDK předstěny W1 4.3						
SOUPIŠ STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR								
číslo položky	číselné zařazení položky	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						
33	347 01-6113.R00	Předstěna SDK, tl.min. 65mm,ocel. kce CW,UW, 1x RBI 12,5mm	m2					
	CS RTS CS URS	stěny - skladba W4.3: 7,035 x 4 + 6,99 x 4						
	CS URS	Příplatek k cenám za zahuštění profilů na vzdálenost 41 cm	m2	56,10	121,18	6 798,20		Dotazy č. 7 Sádrokartonové konstrukce, dotaz č. 1
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 798,20		
						6798,2		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
1	998 01-2023.R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,39	129,00	49,86		
	CS RTS					49,86		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
						6 848,06		
CELKEM								
Vedlejší a ostatní náklady							140,04	
poměrná část dle SOD								
CELKEM bez DPH							6 988,10	

Poznámka: Cena za předstěnu nezahrnuje přípravu pro osazení tabulí (nejsou součástí SOD)

Evidenční list změny stavby

v a evidenční číslo stavby: um ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby v stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií lnění chybějících výměr asf.modifik.pásu pod příčky	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">51</h1>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

dnavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
 ovitel: Zlínstav a.s.
 : Gleeds Česká republika, s.r.o.

přílohy:
 1) Změnový rozpočet s doplněním scházejících výměry modifik.asf.pásu pod příčky -
 ozpočet

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

ois a zdůvodnění změny:
 ůběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ při realizaci stavebních prací, bylo zjištěno, že ve výkaz
 ěr k SOD neobsahuje dodávku a montáž těžkého modifikovaného asfaltového pásu pod zděné příčky, tak aby došlo k separaci od ŽB stropní
 ky. Potřebné množství izolace bylo doplněno.

sový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	15 277,03	0,011%	15 277,03

/vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO OLS R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	26.9.2016	podpis
S:Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	26.9.2016	podpis
	jméno	Vladislav Vondra	datum	26.9.2016	podpis
	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	26.9.2016	podpis
otovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Jiří Hruška	datum	26.9.2016	podpis
	jméno	Ing.Miloslava Jungmannová	datum	26.9.2016	podpis
jednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	26.9.2016	podpis

to Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve
 em jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

řena stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
--------------------------------	-------------

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby

Stavba		Chybějící výměry - Spodní stavba		číslo SO, PS		SO01		
Stavební objekt, Inženýrský objekt,		SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR						
číslo položky	elné zařídění položky Cenová soustava	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místa, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl:	711	izolace proti vodě			14 970,87			
	711 43-1101.R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná pásy na sucho Příčky z přičkovek keramobet. tl. 7 cm stěny - skladba W07:18,95 stěny - skladba W08:68,35 stěny - skladba W12:194,49 Příčky z přičkovek keramobet. tl. 11,5 cm stěny - skladba W13:786,44 Příčky z přičkovek keramobet. tl. 11,5 cm akustická stěny - skladba W14:1996,94 Příčky z přičkovek keramobet. tloušťky 17,5 cm akustická stěny - skladba W15:1597,10	m2	186,33 1,50 5,77 5,19 29,37 89,32 55,18	12,60			
12	62832132 CS RTS	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 35 mineral V 60 S 35 izolace pod příčky 186,33 ztratné, přesahy 15%	m2	214,28	55,97	11 993,22		
14	998 71-1103.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,83	757,68	629,94		

14 970,87

CELKEM bez DPH

306,15

Vedlejší a ostatní náklady

poměrná část dle SOD

15 277,03

CELKEM bez DPH

Evidenční list změny stavby

ev a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby ev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií Plnění kotvení posuvné příčky	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">52</h1>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Stavba: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet s doplněním kotvením posuvné příčky a souvisejících prací - rozpočet
- 2) Náskres

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Obsah a zdůvodnění změny:

Během realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ na základě požadavku uživatele a nad rámec PD bude provedena dodávka a montáž posuvné příčky mezi m.č. 1.53 a 1.54 ve variantě s lepšími akustickými vlastnostmi - 57 dB. Tato posuvná příčka bude ukotvena k průvlaku pomocí 22 ks kotvení.

Právní vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	31 663,07	0,022%	31 663,07

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO S.R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	27.9.2016	podpis
Stavba: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	27.9.2016	podpis
	jméno	Vladislav Vondra	datum	27.9.2016	podpis
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	27.9.2016	podpis
	jméno	Jiří Hruška	datum	27.9.2016	podpis
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing.Miloslava Jungmannová	datum	27.9.2016	podpis
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	27.9.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

název stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby

Stavba	číslo SO, PS		SO01
Stavební objekt,	Doplnění kotvení posuvné příčky		
SOUPIŠ STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR			
číslo položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)
			jednotková cena
			cena položky
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy		850,08

číslo položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)	přesná identifikace polohy (místa, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
7	m ²	23,00	36,96	850,08	pomocné kozové lešení
Díl: 99	Staveništní přesun hmot		4,69		
1	t	0,04	129,00	4,69	

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	30 173,77
767	Dodávka kotvení pro uchycení posuvné příčky Profil 80 mm x 60mm x 6 mm délka 0,4 m, tedy 4,28 kg x 22 ks plotna 80 x 6 mm délka 0,39 m, tedy 1,47 kg x 44 ks	158,84
953 96-1215	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru M 20, délky 170 mm	44,00
URS 2016		216,00
953 96-5131	Kotevní šrouby pro chem.kotvy M 16	44,00
URS 2016		128,00
	Práce statika	2,00
500,00		500,00
155,15		155,15
124	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	0,17

CELKEM bez DPH		31 028,53
Vedlejší a ostatní náklady		634,53
poměrná část dle SOD		
CELKEM bez DPH		31 663,07

CELKEM bez DPH		31 028,53
Vedlejší a ostatní náklady		634,53
poměrná část dle SOD		
CELKEM bez DPH		31 663,07

Evidenční list změny stavby

Evidenční číslo stavby:

ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby

veřejného objektu/provozního souboru (SO/PS):

- Centrum ekonomicko manažerských studií

ochranných úhelníků sloupů a rohů v místnostech

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 01

/

Číslo změny stavby:

54

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Projektant: Zlínstav a.s.

Stavba: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

Změnový rozpočet s upřesněním ochrany rohů a sloupů - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ byla upřesněna dodávka a montáž ochranných úhelníků na zděva v provedení nerezovém dle CEMS I. Důvodem je sjednocení prvků původního a nového objektu.

Časový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	51 826,49	0,036%	51 826,49

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	25.10.2016	podpis
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	25.10.2016	podpis
	jméno	Vladislav Vondra	datum	25.10.2016	podpis
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	25.10.2016	podpis
	jméno	Jiří Hruška	datum	25.10.2016	podpis
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	25.10.2016	podpis
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	25.10.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby				
Stavební objekt,		Změna provedení ochranných úhelníků		číslo SO, PS	SO01	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR						
číslo položky	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH) jednotková cena	průběžná identifikace položky (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.			50 787,88		
	NEREZ					
61a	X28a ochranný roh ve tvaru „L“ 40/40mm k ochranné hraně sloupů a zděva v seminárních místnostech – rozměr 150cm materiál: příplatek za materiál nerez	kus	316,00	96,01	30 338,88	
61b	X28b ochranný roh ve tvaru „L“ 40/40mm k ochranné hraně sloupů a zděva v seminárních místnostech – rozměr 250 cm materiál: nerez	kus	22,00	929,50	20 449,00	Ochranné rohy, dotaz č. 3
CELKEM bez DPH				50 787,88		
Vedlejší a ostatní náklady				1 039,61		
poměrná část dle SOD						
CELKEM bez DPH				51 826,49		

Evidenční list změny stavby

Evidenční číslo stavby:

ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby

vebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Centrum ekonomicko manažerských studií

i přívodu k osoušečům

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 01

/

Číslo změny stavby:

55

avatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

tel: Zlínstav a.s.

leeds Česká republika, s.r.o.

ohy:

Změnový rozpočet s vyčíslením změn v souvislosti s přívodem silnoproudu k osoušečům a související práce - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

is a zdůvodnění změny:

růběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ GP vydal výkaz výměr položek, které vystihují doplnění řadu silnoproudu k el. osoušečům a potřebné související práce. Dále byla odečtena dodávka a montáž osoušeče, který se nebude dodávat.

asový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 625,36	0,00%	31 609,81	0,022%	29 984,45

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	2.11.2016	podpis
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	2.11.2016	podpis
	jméno	Vladislav Vondra	datum	2.11.2016	podpis
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	2.11.2016	podpis
	jméno	Jiří Hruška	datum	2.11.2016	podpis
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing.Miloslava Jungmannová	datum	2.11.2016	podpis
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	2.11.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Stavba		ELEKTRO INSTALACE - SILNOPROUD NN			číslo SO, PS		S001	
Stavební objekt, Inženýrský objekt, Provozní soubor		SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR						
číslo položky	číselné zařazení položky Cenová soustava	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
1.		Rozvaděče						
1.8		Rozvaděč IIP1-RS-1	kpl	1,00	3 028,00	3 028 Kč	Rozvaděč IIP1-RS-1, dle části 17.06 výkresové dokumentace	Dovybavení rozvaděče
1.12		Rozvaděč IIP2-RS-1	kpl	1,00	3 028,00	3 028 Kč	Rozvaděč IIP2-RS-1, dle části 17.10 výkresové dokumentace	Dovybavení rozvaděče
1.14		Rozvaděč IIP3-RS-1	kpl	1,00	3 028,00	3 028 Kč	Rozvaděč IIP3-RS-1, dle části 17.12 výkresové dokumentace	Dovybavení rozvaděče
1.15		Rozvaděč IIP4-RS-1	kpl	1,00	3 028,00	3 028 Kč	Rozvaděč IIP4-RS-1, dle části 17.13 výkresové dokumentace	Dovybavení rozvaděče
2.		Instalační přístroje a svítidla						
2.1.		Instalační přístroje zvýšený standard						
		Instalační přístroje ostatní						
2.1.29		Přístrojová krabice, instalace pod omítku						
							Množství určeno z jednotlivých podlaží dle části 01-13 výkresové dokumentace	
2.1.32		Volný vývod 1fáz, zakončen svorkami v krabici	kpl	4,00	5,10	20 Kč		
			kpl	4,00	27,80	111 Kč		
				0,00			1PP, dle části 02 výkresové dokumentace	
				1,00			1NP, dle části 04 výkresové dokumentace	
				1,00			2NP, dle části 06 výkresové dokumentace	
				1,00			3NP, dle části 08 výkresové dokumentace	
				1,00			4NP, dle části 10 výkresové dokumentace	
				1,00			5NP, dle části 12 výkresové dokumentace	
				0,00			Střecha, dle části 13 výkresové dokumentace	
				0,00				

2.1.36	Drobný instalační materiál	kpl	1,00	680 Kč	680 Kč	
3.	Kabely a kabelové trasy					
3.2.	Kabely s funkční odolností při požáru, dle vyhl. Č.23/2008					
3.1.16	Kabel CXKH-R(J) 3x2,5					
		m	278,00	22,00	6 116 Kč	Množství určeno z výšky jednotlivých podlaží a průběhu kabeláže přes tato podlaží dle částí 01-13 a 15,16 výkresové dokumentace
3.5.	Kabelové trasy					
3.5.23	Přichytka kabelu do 46mm	kpl	94,00	21,00	1 974 Kč	dle částí 01 až 12 výkresové dokumentace,
8.	Instalace					
8.1	Instalace kabeláže (uložení do nosných systémů, pod omítku)	kpl	1,00	3 078 Kč	3 078 Kč	
8.4	Instalace koncových prvků	kpl	1,00	40 Kč	40 Kč	
8.5	Kompletace rozvaděčů	kpl	1,00	2 100 Kč	2 100 Kč	
9.	Ostatní					
9.2	Požární ucpávky, do 150x100mm	kpl	1,00	244,90	245 Kč	
9.5	Průrazy stěn do 150mm	kpl	1,00	53,10	53 Kč	
9.10	Průrazy stropu	kpl	8,00	187,40	1 499 Kč	
9.18	Dílenská dokumentace	kpl	1,00	2 980,00	2 980 Kč	
33	R95 21-28 X15.2 el. osušovač rukou mají - WC pro handicapované - nástěnný, bezdotykový, horkovzdušný, čelní stěna v provedení proti otiskům prstů Die SOD : 7 Die PD : 6	kus	-1,00	1 625,36	-1 625,36	Dotazy č. 8 Osušovače rukou, dotaz č. 6
CELKEM					29 383,55	

Vedlejší a ostatní náklady

poměrná část dle SOD

600,89

CELKEM bez DPH

29 984,45

Evidenční list změny stavby

evidenční číslo stavby:

n ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby

stavěbního objektu/provozního souboru (SO/PS):

- Centrum ekonomicko manažerských studií

- úprava střechy CEMS I. - kačírek

Číslo SO/PS /
 / číslo změny SO/PS:

SO 01

/

Číslo změny stavby:

56

navatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

vitel: Zlínstav a.s.

Gleeds Česká republika, s.r.o.

ilohy:

Změnový rozpočet s úpravou kačírku a souvisejících prací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

pis a zdůvodnění změny:

růběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ na základě upřesnění GP, bylo rozhodnuto o úpravě adby střechy CEMSI na základě stávajícího stavu po odhalení skladby. Z důvodu zachování stávajícího přetížení střechy je nutno snížit vrstvu šířku. Tato úprava byla ověřena statickým výpočtem stávající nosné konstrukce.

asový vliv na plnění SoD:

NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-3 490,34	-0,002%	0,00	0,000%	-3 490,34

Vyjádření - souhlas se změnou:

	jméno		datum	podpis
Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	Ing.arch. Jakub Volka		25.10.2016	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	Václav Polata		25.10.2016	
	Vladislav Vondra		25.10.2016	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	Ing. Stanislav Morávek		25.10.2016	
	Jiří Hruška		25.10.2016	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	Ing. Miloslava Jungmannová		25.10.2016	
	Ing. Josef Kúrka		25.10.2016	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby						
Stavební objekt, Inženýrský objekt, Provozní soubor		IS 030 - Úprava skladby střechy na CEMS I.				číslo SO, PS		
		SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR						
číslo položky	číselné zařazení položky Cenová soustava	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
					jednotková cena	cena položky		
Díl:	712	Živičné krytiny					-3 420,39	
1	712 39-1382.RZ1	Násys z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5 cm tl. 5cm - včetně dodávky kameniva	m2	-33,80	101,20		-3 420,39	výměra odečtena z digitálních podkladů, výpis skladeb, sřechy
15	998 74-2103.R00 CS RTS	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	-2,79	173,36		-483,41	
CELKEM							-3 420,39	
Vedlejší a ostatní náklady							-69,95	
poměrná část dle SOD								
CELKEM bez DPH							-3 490,34	

SO01	
------	--

Evidenční list změny stavby

a evidenční číslo stavby:

Číslo změny stavby:

um ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

58

/ stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01

/

1 - Centrum ekonomicko manažerských studií

ty a upřesnění provedení dveří dřevěných, ocelových i hliníkových

dnavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

ovitel: Zlínstav a.s.

: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

1) Změnový rozpočet s vyčíslením změn provedení dveří a souvisejících prací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

opis a zdůvodnění změny:

průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ bylo zjištěno, že není soulad mezi specifikacemi dveří ve pisu výrobků a zprávou PBR. Byla tedy provedena revize všech dřevěných, ocelových i hliníkových dveří a rozdíly byly vyčísleny.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-8 709,20	-0,01%	245 130,40	0,170%	236 421,20

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	8.11.2016	podpis
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	8.11.2016	podpis
	jméno	Vladislav Vondra	datum	8.11.2016	podpis
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	8.11.2016	podpis
	jméno	Jiří Hruška	datum	8.11.2016	podpis
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	8.11.2016	podpis
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	8.11.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

058 - Upřesnění provedení dveří - Dotazy k PD č. 9

stavba							Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby		
název objektu, výrazky provozního úboru		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			číslo SO, PS	SO01			
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR									
číslo položky	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		poznámky			
				jednotková cena	cena položky				
66	Konstrukce truhlářské								
ŘE DŘEVĚNÉ									
18	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 2křídlové, EI30DP3-C-S 125x197 (křídla 80+45), upřesnění popisu: nouzový dveřní uzávěr typu "A" dle ČSN EN 179 na běžně otevíravém křídle (upřesnění dle PBŘS) 1NP:D101	kus	1	4 466	4 466,00	v tabulce dveří bylo poznačeno panikové kování - dle poznámek pod tabulkou dveří se jedná o panikovou kliku (zámek)			
	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 2křídlové, EI30DP3-C-S 125x197 (křídla 80+45), změna popisu: min.š.dveřního křídla 0,9m (změna dle PBŘS) 1NP:D101	kus	1	bez dopadu na cenu		rozšíření aktivního křídla			
36	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 1křídlové, EI30DP3-C-S 90x197 upřesnění popisu: nouzový dveřní uzávěr typu "A" dle ČSN EN 179 (upřesnění dle PBŘS) 1NP:D102	kus	1	4 466	4 466,00	v tabulce dveří bylo poznačeno panikové kování - dle poznámek pod tabulkou dveří se jedná o panikovou kliku (zámek)			
36	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 2křídlové, EW30DP3-C 125x197 (křídla 80+45), doplnění popisu: nouzový dveřní uzávěr typu "A" dle ČSN EN 179 na běžně otevíravém křídle (doplnění dle PBŘS) 1NP:D108	kus	1	4 466	4 466,00	doplnění panikového kování - paniková klika (zámek)			
	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 2křídlové, EW30DP3-C 125x197 (křídla 80+45), změna popisu: min.š.dveřního křídla 0,825m (změna dle PBŘS) 1NP:D108	kus	1	bez dopadu na cenu		rozšíření aktivního dveřního křídla			
36	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 2křídlové, EW30DP3-C 125x197 (křídla 80+45), doplnění popisu: nouzový dveřní uzávěr typu "A" dle ČSN EN 179 na běžně otevíravém křídle (doplnění dle PBŘS) 1NP: D109	kus	1	4 466	4 466,00	doplnění panikového kování - paniková klika (zámek)			
	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 2křídlové, EW30DP3-C 125x197 (křídla 80+45), změna popisu: min.š.dveřního křídla 0,825m (změna dle PBŘS) 1NP: D109	kus	1	bez dopadu na cenu		rozšíření aktivního dveřního křídla			
36	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 1křídlové, EW30DP3-C 90x197, doplnění popisu: nouzový dveřní uzávěr typu "A" dle ČSN EN 179 na běžně otevíravém křídle (doplnění dle PBŘS), 1NP:D110	kus	1	4 466	4 466,00	doplnění panikového kování - paniková klika (zámek)			

	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 2křídlové, EW30DP3-C 180x197 (křídla 90+90) změnapopisu: PANIK dle ČSN EN 1125 na běžně otevíravém křídle (změna dle PBŘS a GP)	kus	1	14 950	14 950,00	v tabulce prvků bylo poznačeno panikové kování - dle poznámek pod tabulkou dveří se změna o panikovou kliku - změna za panikovou hrazdu na jednom křídle
	2NP:D201					
	dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 1křídlové, EW15DP3-C 90x197, doplnění popisu: požární odolnosti EW 15 DP3+C (doplnění dle PBŘS) příplatek za změnu PO	kus	1	169,84	169,84	doplnění požární odolnosti
	4NP:D424					
auto ožkou je nrazen L 37, y bude rušen	Doplnění panikového kování včetně všech souvisejících komponentů na dvoukřídlové dveře ve stáv. Budově CEMS I. upřesnění popisu: panikové kování dle ČSN EN 1125 (upřesnění popisu dle PBŘS)	kus	3	37 960	113 880,00	v tabulce prvků bylo poznačeno panikové kování - dle poznámek pod tabulkou dveří se změna o panikovou kliku - změna za panikové hrazdy na obou křídlech včetně ostatních komponentů (překování zámky a pod)
	Dvoukřídlové dveře D 131, D 132, D 229					
	Rozpis potřebných dodávek na 1 ks dvoukřídlových dveří	kus				
	centrální zámek jednobodový	1				
	centrální zámek dvoubodový	1				
	centrální zadní díl	2				
	vrchní nebo spodní jazyk	2				
	svislé táhlo s krytkou 1365mm	2				
	svislé táhlo s krytkou 950mm	1				
	uzávěr FR-EV1	2				
	uzávěr spodní FR-NEREZ	1				
	paniková tyč BAR do 1000mm	2				
	podložka pod venkovní kování	1				
	venkovní koule s pol vložkou	1				
	koordinátor pro dvoukřídlové dveře	1				
	samoavírač	2				
	kluzná lišty - EV1	1				
	montáž	1				
	CELKEM				151 329,84	
767	Konstrukce zámečnické					
	DVEŘE OCELOVÉ					
83	dveře ocelové vnitřní hladké plné, 1křídlové, EW30DP1-C 80x197, změny popisu: požární odolnosti EW 30 DP3+C (změna dle PBŘS) sleva za změnu PO	kus	-1	1 652	-1 651,76	změna specifikace požární odolnosti a bez kouřotěsnosti
	1PP:D025					
92	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plné, 2křídlové, EI30DP3-C-S 160x197 (křídla 90+70) změny popisu: požární odolnosti EI 30 DP3+C+S (změna dle PBŘS) sleva za změnu PO	kus	-1	4 609	-4 609,04	změna specifikace požární odolnosti včetně kouřotěsnosti
	1PP: D036					
36	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plné, 2křídlové, EW90DP1-C 160x197 (křídla 90+70) doplnění popisu: nouzový dveřní uzávěr typu "A" dle ČSN EN 179 na běžně otevíravém křídle (doplnění dle PBŘS)	kus	1	4 466	4 466,00	doplnění panikového kování - paniková klika (zámek)
	1PP: D036					

27	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plné, 2křídlové, EW90DP1-C 160x197 (křídla 90+70) doplnění popisu: koordinátor (doplnění dle PBŘS) 1PP: D036	kus	1	3 010	3 009,60	doplnění koordinátor
36	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plné, 1křídlové, EW30DP3-C 90x197, doplnění popisu: nouzový dveřní uzávěr typu "A" dle ČSN EN 179 (doplnění dle PBŘS) 1PP:D037	kus	1	4 466	4 466,00	doplnění panikového kování - paniková klika (zámek)
CELKEM					5 680,80	
NIKOVÉ VÝROBKY						
1+22	AI/55 - okenní sestava, rozměr /1025x2600/doplnění popisu: +C samozavírač (doplnění dle PBŘS)	kus	1,00	2 185	2 185,04	doplnění samozavírač
56	AID/11 dveře s nadsvětlíkem, sestava, rozměr /2800x3100/ EI30DP1, doplnění popisu: PANIK na dle ČSN EN 1125, min. š. 1,375 m (doplnění dle PBŘS) příplatek	kus	1,00	10 998	10 998,00	doplnění panikového kování - panikových hrazd na obě křídla
56	AID/11 dveře s nadsvětlíkem, sestava, rozměr /2800x3100/ EI30DP1, změna popisu: vzhledem k požadavku doplnění panikových hrazd na obě křídla, nutno použít samozamykací zámek PE 420 a PE 923 PE923 pasive set 3500 zámek samozamykací PE420/35/24 active set zámek samozamykací EA219 kabel vč příslušných koncovek 10314-20 průchodka nerezová	kus	1,00		59 472,00	připočet samozamykacího zámku PE 420 na aktivní křídlo a PE 923 na pasivní křídlo
			1,00	17 192,00		
			1,00	35 200,00		
			2,00	1 290,00		
			2,00	2 250,00		
57	AID/12 dveře s nadsvětlíkem, sestava, rozměr /2800x3100/ EI30DP, doplnění popisu: nouzový dveřní uzávěr typu "A" dle ČSN EN 179 na běžně otevíravém křídle (doplnění dle PBŘS)	kus	1,00	4 466	4 466,00	doplnění panikového kování - paniková klika (zámek)
	AID/12 dveře s nadsvětlíkem, sestava, rozměr /2800x3100/ EI30DP, změna popisu: min. š. dveřního křídla 1,2 m (změna dle PBŘS)	kus	1,00		bez dopadu na cenu	rozšíření aktivního dveřního křídla (v zadání 0,9 m)
60	AIi/13 dveře otočné 2křídlové vnitřní, rozměr /1600x1970/ EI30DP3 C S, změna popisu: min. š. dveřního křídla 1,2 m (změna dle PBŘS)	kus	1,00		bez dopadu na cenu	rozšíření aktivního dveřního křídla (v zadání 0,9 m)
61	AIi/14 dveře otočné 2křídlové vnitřní, rozměr /1400x1970/ C S, změna popisu: min. š. dveřního křídla 1,2 m (změna dle PBŘS)	kus	1,00		bez dopadu na cenu	rozšíření aktivního dveřního křídla (v zadání 0,9 m)
62.1	AIi/15a dveře otočné 1křídlové vnitřní, rozměr /900x1970/ EW15DP3 C3 změny popisu:EW 15 DP3 +C (změna dle PBŘS) - sleva za změnu PO	kus	-1,00	2 448	-2 448,40	změna specifikace požární odolnosti bez kouřotěsnosti
65	AIi/22 dveře otočné 2křídlové vnitřní, rozměr /1600x1970/ EI30DP3 C S, změna popisu: min. š. dveřního křídla 1,2 m (změna dle PBŘS)	kus	1,00		bez dopadu na cenu	rozšíření aktivního dveřního křídla (v zadání 0,9 m)
Díl:	Konstrukce zámečnické				74 672,64	

CELKEM bez DPH

231 683,28

Vedlejší a ostatní náklady

4 737,92

poměrná část dle SOD

CELKEM bez DPH

236 421,20

Evidenční list změny stavby

Číslo a evidenční číslo stavby: Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby Stavby stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií Plnění mot.ovl.rolet, realizace mřížek a změna pohledů.	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 /	Číslo změny stavby: 59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Jednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

OS: Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

1) Změnový rozpočet s doplněním mot.ovládání rolet, real.mřížek a akust.podhl. a souvisejících prací - rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ bylo na základě projektu AV techniky zjištěno, že je potřeba doplnit motorické ovládání zatemňovacích žaluzií jako součást jejich dodávky a montáže. Dále byla upřesněna realizace mříží v hliníkovém rámu. GP vydal IS 032 - Změna pohledu v m.č. 1.77 se změnou realizace akustického pohledu R13, místo něho se provede standardní kazetový pohled R10b

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-17 742,93	-0,01%	67 497,08	0,047%	49 754,15

Vyjádření - souhlas se změnou:

	jméno		datum	podpis
Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	Ing.arch. Jakub Volka		9.11.2016	
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	Václav Polata		9.11.2016	
	Vladislav Vondra		9.11.2016	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	Ing. Stanislav Morávek		9.11.2016	
	Jiří Hruška		9.11.2016	
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	Ing. Miloslava Jungmannová		9.11.2016	
	Ing. Josef Kúrka		9.11.2016	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Stavba		Centrum ekonomicko-manazerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby				SO01	
Stavební objekt,		Doplnění rolet o mot. ovládní, upřesnění real.mřížek a akust.podhledů					
číslo položky	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	cena v Kč (bez DPH) jednotková cena	cena položky	přesná identifikace polohy (místnost, podlaží, způsob výpočtu)	poznámky
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.				52 652,96		
11	X4a vnitřní zatemňovací rolety 280x230cm příplatek za motorické provedení	kus	16,00	3 550,00	0,00	dle Tabulky ostatních výrobků	Dotazy č. 1 Vnitř.zatem.rolety, dotaz č. 1
12	X4b vnitřní zatemňovací rolety 520x180cm příplatek za motorické provedení	kus	2,00	4 850,00	0,00	dle Tabulky ostatních výrobků	Dotazy č. 1 Vnitř.zatem.rolety, dotaz č. 1
79	X37.1 mříž 150x40cm, hliníkový rám, s nerez dráty, Provedení shodné se stávající objektem	kus	-2,00	2 622,40	-5 244,80	dle Tabulky ostatních výrobků	Dotazy č.9 Ostat.výrobky, dotaz č. 26
80	X37.2 mříž 40x308cm, hliníkový rám, s nerez dráty, Provedení shodné se stávající objektem - sleva za změnu rozměrů	kus	-2,00	4 301,12	-8 602,24	dle Tabulky ostatních výrobků	Dotazy č.9 Ostat.výrobky, dotaz č. 25
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				-3 895,89		
12	Podhledy kazetové, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet - podhled R13 - sleva za úpravu podhledu	m2	-9,73	400,40	-3 895,89	dle výpisu skladeb, podlaží 1PP-5NP	IS 032 - Změna podhledu v m.č. 1.77

CELKEM bez DPH

48 757,07 48757,07

Vedlejší a ostatní náklady

997,08

poměrná část dle SOD

CELKEM bez DPH

49 754,15

Evidenční list změny stavby

číslo a evidenční číslo stavby:

Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze - II. Etapa dostavby

stavby stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 - Centrum ekonomicko manažerských studií

změna a upřesnění dřevěných a ocelových dveří

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 01 /

Číslo změny stavby:

60

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Proj. Gleeds Česká republika, s.r.o.

Přílohy:

1) Změnový rozpočet s vyčíslením upřesnění úpravy dveří- rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Průběhu realizace stavby „ČZU - Centrum ekonomicko-manažerských studií - 2. část“ GP vydal revizi dveří, kde bylo upřesněno kování dveří a u některých dveří bylo upuštěno od požadavku na 32 dB na úkor jejich podřezání pro přívod vzduchu.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 121,12	0,00%	1 961,64	0,001%	840,52

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): STOPRO SPOL.S R.O.	jméno	Ing.arch. Jakub Volka	datum	2.11.2016	podpis
TDS: Gleeds Česká republika, s.r.o.	jméno	Václav Polata	datum	2.11.2016	podpis
	jméno	Vladislav Vondra	datum	2.11.2016	podpis
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Ing. Stanislav Morávek	datum	2.11.2016	podpis
	jméno	Jiří Hruška	datum	2.11.2016	podpis
Objednatel: Česká zemědělská univerzita	jméno	Ing. Miloslava Jungmannová	datum	2.11.2016	podpis
	jméno	Ing. Josef Kúrka	datum	2.11.2016	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZL 060 - změny dveří a ocenění těchto změn viz Dotazy k zadávací dokumentaci č. 9, 10

Stavba		Centrum ekonomicko-manažerských studií ČZU v Praze – II. etapa dostavby				
Stavební objekt, inženýrský objekt, Provozní soubor		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		číslo SO, PS	SO01	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR						
číslo položky	popis položky	mměná jednotka a	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)		poznámky
				jednotková cena	cena položky	
766	Konstrukce truhlářské					
Změna kování						
25	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 1křídlové, EW30DP3-C 90x197, změna popisu: koule x klika (změna dle GP vzhledem k funkci čtečky) příplatek 1NP:D110	kus	1	149,60	149,60	změna na koule x klika Dotazy č. 9 - dotaz č. 19
25	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 1křídlové, EW30DP3-C 90x197, změny popisu: koule x klika (změna dle GP vzhledem k funkci čtečky) příplatek 1NP:D117	kus	1	149,60	149,60	změna na koule x klika Dotazy č. 9 - dotaz č. 19
25	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plné, 1křídlové, Ei30DP3-C-S 100x197, změny popisu: koule x klika, klika vždy ze strany šachty (změna dle GP)příplatek 1NP:D104	kus	1	149,60	149,60	změna na koule x klika, nejedná se o doplnění kování v rámci smluvního VV uvažována klika x klika Dotazy č. 10 - dotaz č. 13
25	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plné, 1křídlové, Ei30DP3-C-S 80x197, změny popisu: koule x klika, klika vždy ze strany šachty (změna dle GP)příplatek 1NP:D106	kus	1	149,60	149,60	změna na koule x klika, nejedná se o doplnění kování v rámci smluvního VV uvažována klika x klika Dotazy č. 10 - dotaz č. 13

25	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plné, 1křídlové, EW30DP3-C 60x197, změny popisu: koule x klika, klika vždy ze strany šachty (změna dle GP)příplatek 1NP:D205	kus	1	149,60	149,60	změna na koule x klika, nejedná se o doplnění kování v rámci smluvního VV uvažována klika x klika	Dotazy č. 10 - dotaz č. 13
25	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 1křídlové, EW30DP3-C 60x197, změny popisu: koule x klika, klika vždy ze strany šachty (změna dle GP)příplatek 4NP:D416	kus	1	149,60	149,60	změna na koule x klika, nejedná se o doplnění kování v rámci smluvního VV uvažována klika x klika	Dotazy č. 10 - dotaz č. 13
25	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plné 1křídlové, EW30DP3-C 100x197, změny popisu: koule x klika, klika vždy ze strany šachty (změna dle GP)příplatek 1NP:D105	kus	1	149,60	149,60	změna na koule x klika	Dotazy č. 10 - dotaz č. 13
25	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plné 1křídlové, EW30DP3-C 100x197, změny popisu: koule x klika, klika vždy ze strany šachty (změna dle GP)příplatek 2NP:D203	kus	1	149,60	149,60	změna na koule x klika	Dotazy č. 10 - dotaz č. 13
25	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plné 1křídlové, EW30DP3-C 100x197, změny popisu: koule x klika, klika vždy ze strany šachty (změna dle GP)příplatek 2NP: D204	kus	1	149,60	149,60	změna na koule x klika	Dotazy č. 10 - dotaz č. 13
25	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plné, 1křídlové, EW30DP1-C 100x197, změny popisu: koule x klika, klika vždy ze strany šachty (změna dle GP)příplatek 3NP:D313	kus	1	149,60	149,60	změna na koule x klika	Dotazy č. 10 - dotaz č. 13

25	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plně, 1křídlové, EW30DP1-C 100x197, změny popisu: koule x klika, klika vždy ze strany šachty (změna dle GP)příplatek 3NP:D314	kus	1	149,60	149,60	149,60	změna na koule x klika	Dotazy č. 10 - dotaz č. 13
25	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plně, 1křídlové, EW30DP3-C 60x197, změny popisu: koule x klika, klika vždy ze strany šachty (změna dle GP)příplatek 3NP:D316	kus	1	149,60	149,60	149,60	změna na koule x klika	Dotazy č. 10 - dotaz č. 13
25	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plně, 1křídlové, EW30DP1-C 60x197, změny popisu: koule x klika, klika vždy ze strany šachty (změna dle GP)příplatek 5NP:D506	kus	1	149,60	149,60	149,60	změna na koule x klika	Dotazy č. 10 - dotaz č. 13
	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plně, 1křídlové, EW30DP1-C 100x197, upřesnění popisu: klika vždy ze strany šachty (upřesnění dle GP) 4NP:D413	kus	1	0	0,00	0,00	upřesnění popisu, bez dopadu na cenu	Dotazy č. 10 - dotaz č. 13
	D+M dveře ocelové vnitřní hladké plně, 1křídlové, EW30DP1-C 100x197, upřesnění popisu: klika vždy ze strany šachty (upřesnění dle GP) 4NP: D414	kus	1	0	0,00	0,00	upřesnění popisu, bez dopadu na cenu	Dotazy č. 10 - dotaz č. 13
Zajištění podřezání dveří a zrušení požadavku 32dB								
6	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plně, lamino 1křídlové s povrchovou úpravou 90x197 cm, změny popisu: zrušen požadavek 32dB, podřezání pro přívod vzduchu (změna dle GP) sleva 1PP:D027	kus	-1	160,16	-160,16	-160,16	změna s podřezáním a zrušení 32 dB, z OR vycházeno z podobné s podřezáním z položky D008	Dotazy č. 10 - dotaz č. 12
3	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plně, lamino 1křídlové s povrch.úpravou 70x197 cm, změny popisu: zrušen požadavek 32dB, podřezání pro přívod vzduchu (změna dle GP) sleva	kus	-1	160,16	-160,16	-160,16	změna s podřezáním a zrušení 32 dB	Dotazy č. 10 - dotaz č. 12

3	1PP: D028 D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plně, lamino 1křídlové s povrch.úpravou 70x197 cm, změny popisu: zrušen požadavek 32dB, podřežení pro přívod vzduchu (změna dle GP) sleva 1PP: D029	kus	-1	160,16	-160,16	změna s podřežením a zrušení 32 dB	Dotazy č. 10 - dotaz č. 12
6	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plně, lamino 1křídlové s povrchovou úpravou 90x197 cm, změny popisu: zrušen požadavek 32dB, podřežení pro přívod vzduchu (změna dle GP) 1PP:D030	kus	-1	160,16	-160,16	změna s podřežením a zrušení 32 dB , z OR vycházeno z podobné s podřežením z položky D008	Dotazy č. 10 - dotaz č. 12
6	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plně, lamino 1křídlové s povrchovou úpravou 90x197 cm, změny popisu: zrušen požadavek 32dB, podřežení pro přívod vzduchu (změna dle GP) 1PP:D031	kus	-1	160,16	-160,16	změna s podřežením a zrušení 32 dB , z OR vycházeno z podobné s podřežením z položky D008	Dotazy č. 10 - dotaz č. 12
6	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plně, lamino 1křídlové s povrchovou úpravou 90x197 cm, změny popisu: zrušen požadavek 32dB, podřežení pro přívod vzduchu (změna dle GP) 1PP:D032	kus	-1	160,16	-160,16	změna s podřežením a zrušení 32 dB , z OR vycházeno z podobné s podřežením z položky D008	Dotazy č. 10 - dotaz č. 12
3	D+M dveře dřevěné vnitřní hladké plně, lamino 1křídlové s povrch.úpravou 70x197 cm, změny popisu: zrušen požadavek 32dB, podřežení pro přívod vzduchu (změna dle GP) 1PP: D033	kus	-1	160,16	-160,16	změna s podřežením a zrušení 32 dB	Dotazy č. 10 - dotaz č. 12

CELKEM bez DPH

823,68

Vedlejší a ostatní náklady

poměrná část dle SOD

16,84





CELKEM bez DPH

840,52

Číslo úkolu (činnost)	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. čtvrtletí						
					leden 2016	únor 2016	březen 2016	2. čtvrtletí duben 2016	květen 2016	červen 2016	
CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY			330 dny	25.1.16	28.4.17						
1	Předání staveniště	0 dny	25.1.16	25.1.16	▶ 25.1.						
	Staveniště a přípravné práce	20 dny	29.1.16	25.2.16	████████████████████						
2	Vybudování objektů zahájení staveniště	20 dny	29.1.16	25.2.16	████████████████████						
3	Vybudování staveništních přípojek a osvětlení staveniště	20 dny	29.1.16	25.2.16	████████████████████						
4	Vymezení stávajících sítí	15 dny	5.2.16	25.2.16	████████████████████						
5	Vytýčení stavby	15 dny	5.2.16	25.2.16	████████████████████						
Inženýrské objekty			170 dny	16.5.16	14.4.17						
6	IO 01 Obslužné komunikace a zpev. plochy	170 dny	16.5.16	14.4.17	████████████████████						
	Vazba na ŽL 040 Úprava vsakování										
	Mílník č.3 - obslužné komunikace a zpev. plochy	0 dny	14.4.17	14.4.17	▶ 14.4.17						
7	IO 02 Přípojka sploškové kanalizace	120 dny	16.5.16	28.10.16	████████████████████						
8	IO 02 Přípojka dešťové kanalizace	120 dny	16.5.16	28.10.16	████████████████████						
9	IO 03 Přípojka NN	120 dny	16.5.16	28.10.16	████████████████████						
10.1.	IO 03 Venkovní osvětlení - kabeláže a rozvody	27 dny	22.9.16	28.10.16	████████████████████						
10.2.	IO 03 Venkovní osvětlení - stoláři, svítidla, kompletace	43 dny	15.2.17	14.4.17	████████████████████						
11	IO 04 Terénní a sadová úpravy	60 dny	19.9.16	14.4.17	████████████████████						
Stavební objekty											
12	SO 01 Zemní práce - výkop stavební jámy na pilotovací rovinu. Provedení násypů, provedení ochranné vrstvy pro pilotáž	21 dny	26.2.16	25.3.16	████████████████████						
	Mílník č.2 - SO 01 Zemní práce - výkop stavební jámy na pilotovací rovinu. Provedení násypů, provedení ochranné vrstvy pro pilotáž	0 dny	28.3.16	28.3.16	▶ 28.3.						
13	SO 01 Piloty	14 dny	29.3.16	15.4.16	████████████████████						
14.1.	SO 01 Provedení základových konstrukcí (pro zahájení betonářské kč 1.PP)	25 dny	4.4.16	6.5.16	████████████████████						
	Mílník č.3 - SO 01 Dokončení základových konstrukcí (pro zahájení betonářské kč 1.PP)	0 dny	9.5.16	9.5.16	▶ 9.5.						
15	SO 01 Betonářské skeletu + žb stěn 1PP včetně ŽB stropů	24 dny	10.5.16	10.6.16	████████████████████						
	Mílník č.4 - SO 01 Betonářské skeletu + žb stěn 1PP včetně ŽB stropů	0 dny	13.6.16	13.6.16	▶ 13.6.						
14.2.	SO 01 Provedení základových konstrukcí (pro zahájení betonářské kč 1.NP + 2NP)	14 dny	1.6.16	20.6.16	████████████████████						
16	SO 01 Betonářské skeletu + žb stěn 1NP + 2NP včetně ŽB stropů	45 dny	14.6.16	15.8.16	████████████████████						
	Mílník č.5 - SO 01 Betonářské skeletu + žb stěn 1NP + 2NP včetně ŽB stropů	0 dny	15.8.16	15.8.16	▶ 15.8.						
17	SO 01 Betonářské skeletu + žb stěn 3NP + 4NP+5NP včetně ŽB stropů	45 dny	16.8.16	16.10.16	████████████████████						
	Mílník č.6 - SO 01 Betonářské skeletu + žb stěn 3NP + 4NP+5NP včetně ŽB stropů	0 dny	16.10.16	16.10.16	▶ 16.10.						
18.1.	SO 01 Izolace proti vodě (spodní stavba)	80 dny	9.5.16	26.8.16	████████████████████						
18.2.	SO 01 Izolace proti vodě (vnitřní)	98 dny	17.10.16	1.3.17	████████████████████						
19	SO 01 Sřešení pláště včetně klempířských kč (ukončeno zátopovou zkouškou)	76 dny	1.9.16	15.12.16	████████████████████						
	Mílník č.7 - SO 01 Sřešení pláště včetně klempířských kč (ukončeno zátopovou zkouškou)	0 dny	15.12.16	15.12.16	▶ 15.12.						
20.1.	Izolace tepelné (fasáda a střecha)	63 dny	1.9.16	28.11.16	████████████████████						
20.2.	Izolace tepelné (vnitřní)	37 dny	9.1.17	28.2.17	████████████████████						
21	Izolace akustické a protihesové	37 dny	9.1.17	28.2.17	████████████████████						
22	SO 01 Realizace fasádního pláště včetně oken, dveří	80 dny	1.9.16	21.12.16	████████████████████						
	Mílník č.8 - SO 01 Realizace fasádního pláště včetně oken, dveří	0 dny	22.12.16	22.12.16	▶ 22.12.						
23	SO 01 Ležaté kanalizace sploškové + dešťová 1PP	54 dny	4.4.16	16.6.16	████████████████████						
24	SO 01 Rozvody pod omítkou 1PP - voda, kanalizace, topení, elektro - silnoproud, slaboproud, VZT atd.	112 dny	1.9.16	3.2.17	████████████████████						
25	SO 01 Rozvody pod omítkou 1NP + 2NP - voda, kanalizace, topení, elektro - silnoproud, slaboproud, VZT	112 dny	1.9.16	3.2.17	████████████████████						
	Mílník č.9 - SO 01 Rozvody pod omítkou 1NP + 2NP - voda, kanalizace, topení, elektro - silnoproud, slaboproud, VZT atd.	0 dny	3.2.17	3.2.17	▶ 3.2.17.						
26	SO 01 Rozvody pod omítkou 3NP + 4NP - voda, kanalizace, topení, elektro - silnoproud, slaboproud, VZT	102 dny	17.10.16	7.3.17	████████████████████						
27	SO 01 Montáž tras rozvodů a kabeláží (VZT, chlazení, silno, slabo, voda, topení atd.) v 1PP	103 dny	15.10.16	7.3.17	████████████████████						
28	SO 01 Montáž tras rozvodů a kabeláží nad podhledem (VZT, chlazení, silno, slabo, voda, topení atd.) v 1NP + 2NP	103 dny	15.10.16	7.3.17	████████████████████						
	Mílník č.10 - SO 01 Montáž tras rozvodů a kabeláží nad podhledem (VZT, chlazení, silno, slabo, voda, topení atd.) v 1NP + 2NP	0 dny	7.3.17	7.3.17	▶ 7.3.17.						
29	SO 01 Montáž tras rozvodů a kabeláží nad podhledem (VZT, chlazení, silno, slabo, voda, topení atd.) v 3NP + 4NP	89 dny	15.11.16	17.3.17	████████████████████						
30	SO 01 Zahájení a dokončení montáží VZT ve strojovnách VZT	58 dny	5.1.17	27.3.17	████████████████████						
31	Mílník č.11 - Ukončení všech rozvodů VZT	0 dny	27.3.17	27.3.17	▶ 27.3.17.						
32	Mílník č.12 - SO 01 Dokončení vnitřních instalací	0 dny	27.3.17	27.3.17	▶ 27.3.17.						
33	SO 01 D+M náhradního zdroje	21 dny	6.2.17	6.3.17	████████████████████						
34	SO 01 Hromosvody	91 dny	17.10.16	20.2.17	████████████████████						

Ve Zprávě Datum 9.12.2016
 Úkol Rozdělení Mílník
 Souhrnný Souhrn projektu Vnější úkony
 Vnější měřič Neaktivní úkol Neaktivní měřič
 Neaktivní měřič Pouze s dobou

2016 srpen 2016 září 2016 4. čtvrtletí říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016 1. čtvrtletí leden 2017 únor 2017 březen 2017 2. čtvrtletí duben 2017

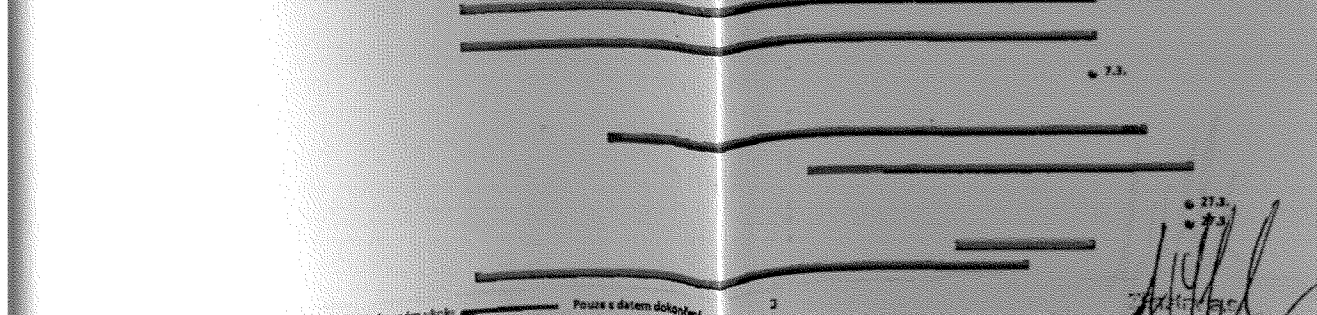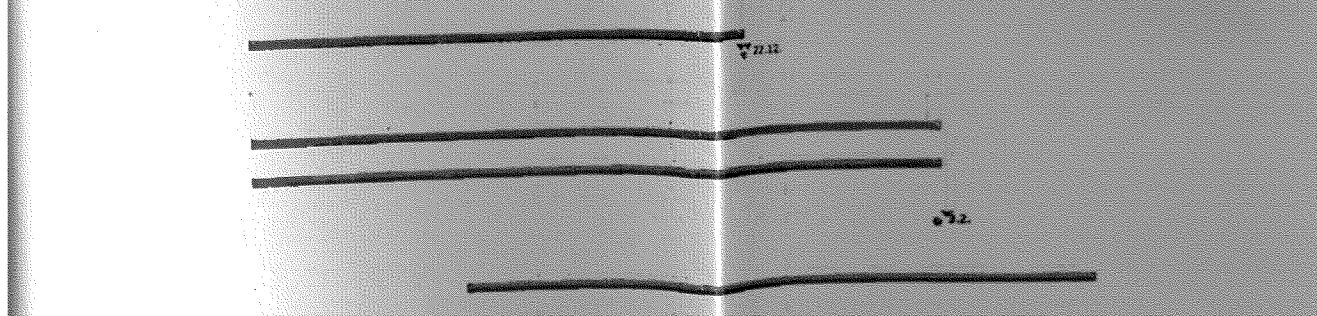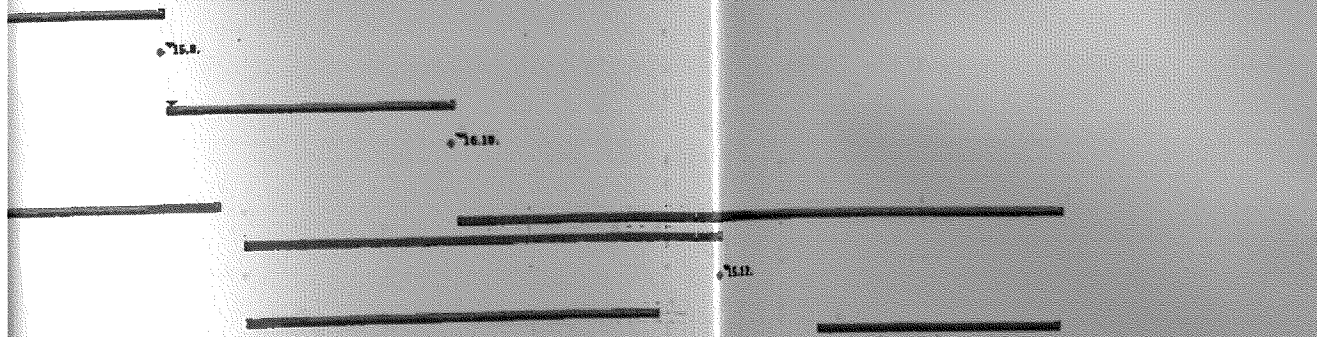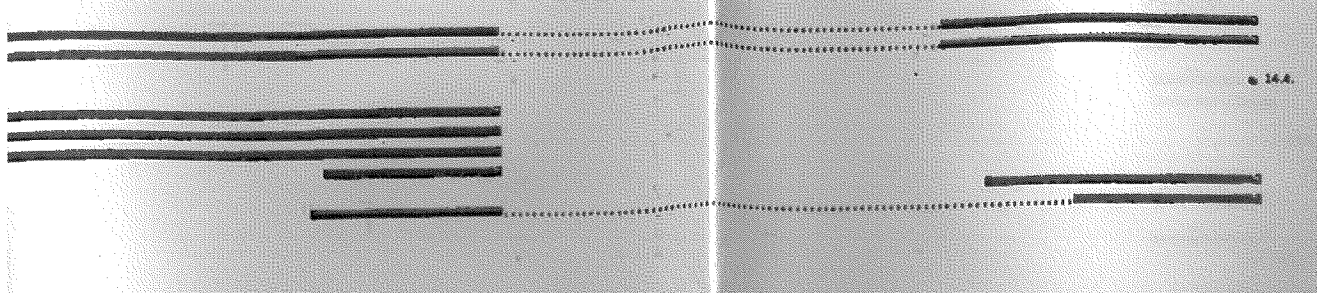

_____ Ruční funkce zahrnuté v souhrnném účtu
 _____ Ruční souhra
 _____ Pouze zahájení

_____ Pouze s dalším dokončením
 _____ konečný termín
 _____ Průběh

3
 4
 37.3
 37.3
 30 01
 Vzorová 3D tiskárna, vedoucí provozu 52 04
 B

2016	srpen 2016	září 2016	4. čtvrtletí říjen 2016	listopad 2016	prosinec 2016	1. čtvrtletí leden 2017	únor 2017	březen 2017	2. čtvrtletí duben 2017
------	------------	-----------	----------------------------	---------------	---------------	----------------------------	-----------	-------------	----------------------------

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Ruční úkony zahrnuté v souhrnném účtu
 Ruční souhra
 Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení
 konečný termín
 Průběh

3
4

27.3.
 27.3.
 00 01
 00 01

Vzor podpisů: Jitřina, vedoucí projektů 52 04

B

Číslo (innosti)	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	1. čtvrtletí leden 2016					2. čtvrtletí duben 2016				
					únor 2016	březen 2016	květen 2016	červen 2016	červen 2016					
35	SO 01 D+M podhledy	39 dny	1.2.17	27.3.17										
36	SO 01 Dodávka a montáž vnitřních dveří	16 dny	14.3.17	4.4.17										
37	SO 01 Realizace podlah (bez finální vrstvy)	37 dny	17.12.16	5.2.17										
38	SO 01 Finální podlahy	30 dny	22.2.17	4.4.17										
	Milník č.13 - SO 01 Finální podlahy	0 dny	4.4.17	4.4.17										
39	SO 01 Obklady keramické	54 dny	15.1.17	29.3.17										
40	SO 01 Nářezky, malby	20 dny	22.3.17	18.4.17										
41	SO 01 Kompletace profesí (žaluzie, svítidla, baterie atd.)	40 dny	22.2.17	18.4.17										
42	D+M výtahů	43 dny	16.1.17	15.3.17										
43	Milník č.14 - SO 01 Stavební připravenost pro montáž nábytku 3NP + 4NP	0 dny	22.3.17	22.3.17										
44	Milník č.15 - SO 01 Stavební připravenost pro montáž nábytku 1PP + 1NP + 2NP	0 dny	22.3.17	22.3.17										
	Montáž nábytku 3NP + 4NP	19 dny	23.3.17	18.4.17										
	Montáž nábytku 1PP+1NP+2NP	19 dny	23.3.17	18.4.17										
	Dokončení stavebních prací (10 dní před předáním a převzetím stavby)	0 dny	18.4.17	18.4.17										
45	Komplexní zkoušky (EPS, EZS, VZT, chlazení, topení atd.)	11 dny	4.4.17	18.4.17										
	DSPS a Dohledy pro kolaudaci a předání a převzetí stavby	18 dny	22.3.17	14.4.17										
46	Milník č.16 - Předání podkladů ke kolaudaci	0 dny	14.4.17	14.4.17										
47														
48	Proškolení obsluhy instalačních zařízení	21 dny	1.4.17	28.4.17										
	Proces předání a převzetí stavby (10 dní)	9 dny	18.4.17	28.4.17										
49	Milník č.17 - Předání a převzetí stavby - obousměrně podepsaný předávací protokol	0 dny	28.4.17	28.4.17										
50	Kolaudace	22 dny	28.4.17	28.5.17										
	Vykázání staveniště (15 dnů od předání a převzetí stavby)	12 dny	29.4.17	13.5.17										

Ve Zlíně
Datum 9.12.2016

Úkol
Rozdělení
Milník

————— Souhrnný
..... Souhrn projektu
♦ Vnější úkoly

————— Vnější milník
————— Neaktivní úkol
————— Neaktivní milník

Neaktivní
Ruční
Pouze

2016

3. čtvrtletí

červenec 2016

srpen 2016

září 2016

4. čtvrtletí

říjen 2016

listopad 2016

prosinec 2016

1. čtvrtletí


leden 2017




únor 2017




březen 2017

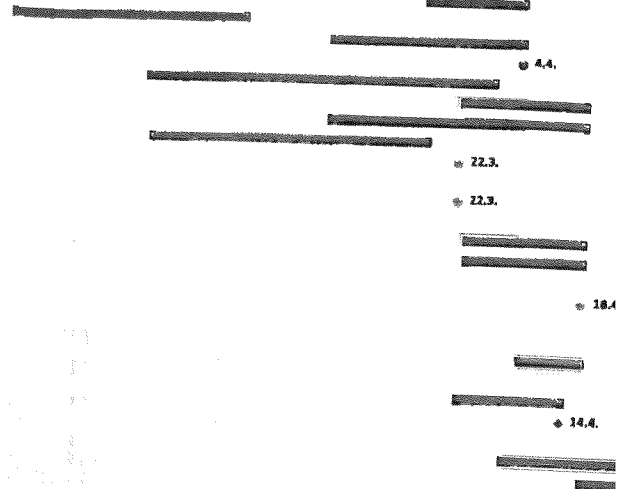

2. čtvrtletí

duben 2017



 Ruční úkony zahrnuté v souhrnném účtu
 Ruční souhrn
 Pouze zahájení

 Pouze s datem dokončení
 Konečný termín
 Průběh


Výplacoval  vedoucí provozu SZ 04
160 01
5
